

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação <b>PARCIAL</b>		Medição nº <b>01</b>	
<b>Contratado :</b> LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		<b>CONVENIO:</b> 948247/2023		<b>Contrato:</b> 031/2025		<b>BDI:</b> 24,88%		<b>Data Medição :</b> 24/03/2026					
<b>Tipo :</b> CONCORRÊNCIA ELETRONICA 006/CPLP/2025		<b>PROCESSO:</b> 1717/2025		<b>Data Base:</b> 16/01/2026				<b>Ref. Período :</b> 16/01/2026 a 17/03/2026					
<b>Objeto :</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERENCIA DO NORTE				<b>Valor do Contrato (R\$) :</b> 249.094,12				<b>Vencimento :</b> Conforme o contrato					
<b>Local :</b> QUERENCIA DO NORTE - DISTRITO				<b>Valor desta Medição :</b> 248.680,07				<b>Saldo Contratual :</b> R\$ 414,05					
Item	Descrição	Un.	Quant.	preço Unit.	preço Unit.	Valor Contratado c/BDI (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
			Prevista	BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										-	8.161,85	-
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	368,36	460,00	2.760,00	0,00%	100,00%	0,00%	-	2.760,00	-	
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	1.177,78	1.470,81	4.412,43	0,00%	100,00%	0,00%	-	4.412,43	-	
1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DESERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMP. MAE: 78472 01/2020)	M2	945,00	0,34	0,42	396,90	0,00%	100,00%	0,00%	-	396,90	-	
1.4	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	1.039,50	0,46	0,57	592,52	0,00%	100,00%	0,00%	-	592,52	-	
<b>2.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										-	33.492,24	-
2.1	Administração local (Engenheiro civil e encarregado de obras com encargos complementares)	MÊS	3,00	8.939,85	11.164,08	33.492,24	0,00%	100,00%	0,00%	-	33.492,24	-	
<b>3.0</b>	<b>EXECUÇÃO DE CALÇADAS</b>										-	201.363,56	-
3.1	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	945,00	5,00	6,24	5.896,80	0,00%	100,00%	0,00%	-	5.896,80	-	
3.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	945,00	2,23	2,78	2.627,10	0,00%	100,00%	0,00%	-	2.627,10	-	
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	766,78	86,51	108,03	82.835,24	0,00%	100,00%	0,00%	-	82.835,24	-	
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 4 CM, ARMADO. AF_08/2022(FUNDO PODOTÁTIL)	M3	178,22	86,51	108,03	19.253,11	0,00%	100,00%	0,00%	-	19.253,11	-	
3.5	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	652,23	49,44	61,74	40.268,68	0,00%	100,00%	0,00%	-	40.268,68	-	
3.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	92,88	131,75	164,52	15.280,62	0,00%	100,00%	0,00%	-	15.280,62	-	
3.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO 25cm x 25 cm, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	178,22	158,17	197,52	35.202,01	0,00%	100,00%	0,00%	-	35.202,01	-	
<b>4.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										-	5.662,42	414,05
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	945,00	2,06	2,57	2.428,65	0,00%	100,00%	0,00%	-	2.428,65	-	

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação <b>PARCIAL</b>		Medição nº <b>01</b>	
<b>Contratado :</b> LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		<b>CONVENIO:</b> 948247/2023		<b>Contrato:</b> 031/2025		<b>BDI:</b> 24,88%		<b>Data Medição :</b> 24/03/2026					
<b>Tipo :</b> CONCORRÊNCIA ELETRONICA 006/CPLP/2025		<b>PROCESSO:</b> 1717/2025		<b>Data Base:</b> 16/01/2026				<b>Ref. Período :</b> 16/01/2026 a 17/03/2026					
<b>Objeto :</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERENCIA DO NORTE				<b>Valor do Contrato (R\$) :</b> 249.094,12				<b>Vencimento :</b> Conforme o contrato					
<b>Local :</b> QUERENCIA DO NORTE - DISTRITO		<b>Valor desta Medição :</b> 248.680,07						<b>Saldo Contratual :</b> R\$ 414,05					
Item	Descrição	Un.	Quant.	preço Unit.	preço Unit.	Valor Contratado c/BDI (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
			Prevista	BDI (R\$)	Com BDI (R\$)		Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado	
4.2	Espalhamento de material em bota-fora	M3	18,54	1,61	2,01	37,27	0,00%	100,00%	0,00%	-	37,27	-	
4.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS . AF_07/2024	M2	169,43	17,07	21,31	3.610,55	0,00%	88,53%	11,47%	-	3.196,50	414,05	
<b>Observação :</b>						<b>Total Contratado :</b>		<b>Valor Bruto dos Serviços</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 248.680,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>
								<b>( - ) DESCONTOS</b>					
								% concluído da obra 99,83%			% Nessa Medição <b>99,83%</b>		
								Valor dos Serviços					
								Valor ISSQN a recolher (DUAM)					
								<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>					
								<b>LIQUIDO A PAGAR C/BDI</b>			R\$ 0,00	<b>R\$ 248.680,07</b>	
<b>DE ACORDO :</b>						<b>VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS</b>							
Contratado		Eng. Fiscal da Obra		Membros da Comissão		Membros da Comissão							



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
Secretaria Municipal de planejamento SEMPLAN

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

No dia **18 de março de 2026** em conformidade com a verificação da COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS E MATERIAIS, procedeu-se a vistoria dos serviços objeto do Contrato nº 031/2025 e Processo n.º 1717/2025, contrato de repasse 948247/2023 que se refere à **CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERENCIA DO NORTE**, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, e a Firma **LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 14.372.416/0001-45**, ao valor global de **R\$ 249.094,28** (duzentos e quarenta e nove mil noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obra e Serviços Públicos, cumprindo assim com a implantação do objeto, constatamos a aplicação de parte do material especificado em planilha orçamentária.

Nesta data está sendo realizada a **1ª Medição** referente ao objeto em questão no valor de **R\$ 248.680,07** (Duzentos e quarenta e nove mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). correspondendo a 100,00% nesta mediação somando a um total de 100,00% do valor Global.

Após a verificação da execução dos serviços conforme referência acima, emitiremos o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, necessário como este.

Primavera de Rondônia - RO, 24 de março de 2026.

**Membros da comissão:**

**CLAUDIR FERREIRA DUARTE**  
ASSESOR DE ENGENHARIA

**DIEGO LOURENÇO**  
Agente Administrativo (semosp)

**LEANDRO ALVES CASTRO**  
Diretor da Divisão de Frotas



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**



OBJETO

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE QUERENCIA DO NORTE

Responsável Técnico

CONTRATO N°

031/2025

CONVÊNIO: 948247/2023

Claudir Ferreira Duarte

END:

RUAS E AVENIDAS DE QUERENCIA DO NORTE

PROC. 1717/2025

CREA: 17598 D/RO

LOCAL

QUERENCIA DO NORTE - DISTRITO

18032026

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª medição**



23/01/2026 8:43 AM  
11°58'29"S 61°22'37"W



23/01/2026 8:43 AM  
11°58'29"S 61°22'37"W



23/01/2026 9:03 AM  
11°58'29"S 61°22'34"W



23/01/2026 9:04 AM  
11°58'33"S 61°22'36"W



19/02/2026 3:06 PM  
11°58'33"S 61°22'36"W  
Avenida Costa e Silva  
Primavera de Rondonia  
Rondonia



19/02/2026 3:11 PM  
11°58'32"S 61°22'38"W  
Primavera de Rondonia  
Rondonia



19/02/2026 3:11 PM  
11°58'32"S 61°22'38"W  
Primavera de Rondonia  
Rondonia



19/02/2026 3:14 PM  
11°58'28"S 61°22'37"W



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**



OBJETO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE QUERENCIA DO NORTE

CONTRATO N° 031/2025

CONVÊNIO: 948247/2023

Responsável Técnico  
 Claudir Ferreira Duarte  
 CREA: 17598 D/RO


END: RUAS E AVENIDAS DE QUERENCIA DO NORTE

PROC. 1717/2025

LOCAL QUERENCIA DO NORTE - DISTRITO

18032026

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª medição**

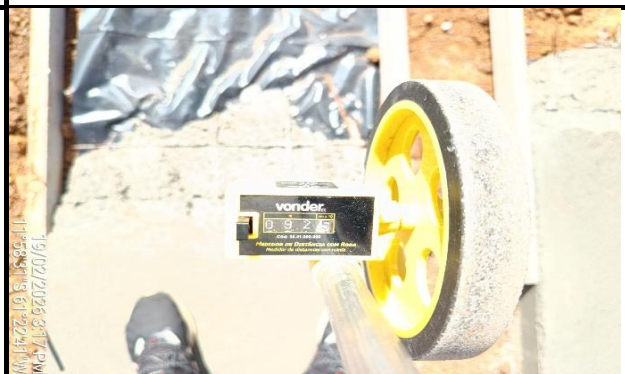

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA



OBJETO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE QUERENCIA DO NORTE

CONTRATO N° 031/2025

CONVÊNIO: 948247/2023

END: RUAS E AVENIDAS DE QUERENCIA DO NORTE

PROC. 1717/2025

LOCAL QUERENCIA DO NORTE - DISTRITO

18032026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª medição

