

Proc. 1139/20
Fis. 1.747

Proc. 1139/2020
Fis. 1.744

Proc. 1139/2020
Fis. 2044

Proc. 1139/20
Fis. 135

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCAL: PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO

Planilha de Medições									
Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Valor Total	1ª Medição 15/03/2021	2ª Medição 26/04/2021	
1	ADMINISTRAÇÃO E NR-18					18.231,00	R\$ 9.655,47 52,96%	R\$ 2.858,51 15,67%	
1.1	Administração e taxas					18.231,00	R\$ 9.655,47 52,96%	R\$ 2.858,51 15,67%	
1.1.1	Administração e controle - (Visita técnica engenheiro)	4,0	2,0	50,0%	4.443,92	8.887,84	R\$ 2.221,96 25,00%	R\$ 2.221,96 25,00%	
1.1.2	Taxas e Emolumentos- (ART)	1,0	1,0	100,0%	146,19	146,19	R\$ 146,19 100,00%		
1.1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50 m x 2,00m)	3,0	3,0	100,0%	266,67	266,67	R\$ 266,67 100,00%		
1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	4,0	2,0	50,0%	596,18	1.192,36	R\$ 298,09 25,00%	R\$ 298,09 25,00%	1,0
1.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	4,0	2,0	50,0%	676,92	1.353,84	R\$ 338,46 25,00%	R\$ 338,46 25,00%	1,0
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	6,25	6,25	100,0%	2.252,50	2.252,50	R\$ 2.252,50 100,00%		
1.1.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	12,0	12,0	100,0%	4.131,60	4.131,60	R\$ 4.131,60 100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					14.317,83	R\$ 14.317,83 100,00%		
2.1	PREPARO DO TERRENO					5.335,16	R\$ 5.335,18 100,00%		
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	55,6	55,6	100,0%	1.385,55	1.385,55	R\$ 1.385,55 100,00%		
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	50,99	50,99	100,0%	2.672,38	2.672,38	R\$ 2.672,38 100,00%		
2.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	40,19	40,19	100,0%	1.277,23	1.277,23	R\$ 1.277,23 100,00%		
2.2	ATERRO COM OU S/ COMPACTAÇÃO					8.982,67	R\$ 8.982,68 100,00%		
2.2.1	Execução e Compactação de Aterro com Solo Predominantemente Argiloso - Inclusive Solo, Carga e Transporte.	292,5	292,5	100,0%	8.982,67	8.982,67	R\$ 8.982,67 100,00%		
3	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES					16.692,80	R\$ 15.952,53 95,56%		
3.1	CONCRETOS					4.391,91	R\$ 4.391,93 100,00%		
3.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,92	0,92	100,0%	182,73	182,73	R\$ 182,73 100,00%		
3.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,69	5,69	100,0%	1.459,31	1.459,31	R\$ 1.459,31 100,00%		
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,11	5,11	100,0%	1.310,56	1.310,56	R\$ 1.310,56 100,00%		
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	10,8	10,8	100,0%	1.439,31	1.439,31	R\$ 1.439,31 100,00%		
3.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					6.322,88	R\$ 6.322,89 100,00%		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	49,23	49,23	100,0%	3.453,48	3.453,48	R\$ 3.453,48 100,00%		
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	89,95	89,95	100,0%	2.869,40	2.869,40	R\$ 2.869,40 100,00%		
3.3	ARMADURAS					4.974,78	R\$ 4.974,81 100,00%		
3.3.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	133,09	133,09	100,0%	1.204,46	1.204,46	R\$ 1.204,46 100,00%		
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	125,36	125,36	100,0%	990,34	990,34	R\$ 990,34 100,00%		
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	117,27	117,27	100,0%	816,19	816,19	R\$ 816,19 100,00%		


Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139/20
Fis. 1748

Proc. 1189/2020
Fis. 1745

Proc. 1139/2020
Fis. 2045

Proc. 1139/20
Fis. 139

3.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	227,27	227,27	100,0%	1.361,34	1.361,34	227,27 R\$ 1.361,34 100,00%	
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	122,45	122,45	100,0%	602,45	602,45	122,45 R\$ 602,45 100,00%	
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA					1.003,23	R\$ 262,90 26,20%	
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	60,95	60,95	100,0%	1.003,23	1.003,23	15,9721 R\$ 262,90 26,21%	44,9779 R\$ 740,33 73,79%
4	SUPERESTRUTURA					20.160,26		
4.1	CONCRETOS					3.090,77		
4.1.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,94	4,45	90,08%	1.141,29	1.266,96	4,45 R\$ 1.141,29 90,08%	
4.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,35	3,92	90,11%	1.005,36	1.115,64	3,92 R\$ 1.005,36 90,12%	
4.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,8	0,0	0,0%	0,00	461,64		
4.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	11,09	8,37	75,47%	186,06	248,53	8,37 R\$ 186,06 75,47%	
4.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					7.919,94		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	87,84	79,06	90,0%	3.099,94	3.444,20	79,06 R\$ 3.099,94 90,00%	
4.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	140,57	126,51	90,0%	4.028,07	4.475,74	126,51 R\$ 4.028,07 90,00%	
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA					2.171,41		
4.3.1	LAJE PRÉ-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	36,36	0,0	0,0%	0,00	2.171,41		
4.4	ARMADURAS					5.593,33		
4.4.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	202,55	182,0	89,85%	1.647,10	1.833,07	182,0 R\$ 1.647,10 89,85%	
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	75,73	68,16	90,0%	538,46	598,26	68,16 R\$ 538,46 90,00%	
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	67,55	60,8	90,01%	423,16	470,14	60,8 R\$ 423,16 90,01%	
4.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	306,91	276,21	90,0%	1.654,49	1.838,39	276,21 R\$ 1.654,49 90,00%	
4.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	173,47	156,12	90,0%	768,11	853,47	156,12 R\$ 768,11 90,00%	
4.5	CINTAS E VERGAS					1.384,81		
4.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,2	5,0	96,15%	78,55	81,69	5,0 R\$ 78,55 96,16%	
4.5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	18,95	18,9	99,74%	369,49	370,47	18,9 R\$ 369,49 99,74%	
4.5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	5,2	5,2	100,0%	80,70	80,70	5,2 R\$ 80,70 100,00%	
4.5.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	18,95	18,95	100,0%	343,75	343,75	18,95 R\$ 343,75 100,00%	
4.5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	13,8	13,8	100,0%	349,14	349,14	13,8 R\$ 349,14 100,00%	
4.5.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,1	5,1	100,0%	159,06	159,06	5,1 R\$ 159,06 100,00%	
5	PAREDES E PAÍNES					18.535,88		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS					18.535,88		
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	331,59	232,11	70,0%	12.974,94	18.535,88	232,11 R\$ 12.974,94 70,00%	
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE					12.417,82		
6.1	CHAPISCO					1.558,47		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	663,18	0,0	0,0%	0,00	1.558,47		
6.2	EMBOÇO					7.045,02		

Tasso Fernando Suede
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RQ

Proc. 1139/20
Fis. 1.749

Proc. 1139/2020
Fis. 1.746

Proc. 1139/2020
Fis. 2646

Proc. 1139/20
Fis. 146

6.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	100,14	0,0	0,0%	0,00	2.239,13
6.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	207,24	0,0	0,0%	0,00	4.805,89
6.3	PASTILHA. CERÂMICA, PLACA PRÉ MOLDADA E OUTROS					3.814,33
6.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	100,14	0,0	0,0%	0,00	3.814,33
7	COBERTURA					8.049,18
7.1	MADEIRAMENTO					4.022,02
7.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	114,23	0,0	0,0%	0,00	886,42
7.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	114,23	0,0	0,0%	0,00	829,30
7.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	114,23	0,0	0,0%	0,00	2.306,30
7.2	FORRO PVC					2.649,40
7.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	108,85	0,0	0,0%	0,00	2.649,40
7.3	CALHA METÁLICA					474,72
7.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	18,4	0,0	0,0%	0,00	474,72
7.4	RUFO METÁLICO					903,04
7.4.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	42,9	0,0	0,0%	0,00	903,04
8	PISO					17.855,80
8.1	LASTROS/FUNDAÇÕES DIVERSAS					6.803,73
8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	163,12	0,0	0,0%	0,00	1.608,36
8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	163,12	0,0	0,0%	0,00	5.195,37
8.2	PISO CERÂMICO					5.411,06
8.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	147,28	0,0	0,0%	0,00	5.411,06
8.3	RODAPÉ CERÂMICO					511,11
8.3.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	120,83	0,0	0,0%	0,00	511,11
8.4	PISO CONCRETO (CALÇADA INTERNA)					5.129,90
8.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	134,08	0,0	0,0%	0,00	5.129,90
9	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					15.801,79
9.1	JANELA VIDRO TEMPERADO					6.054,55
9.1.1	J-01. Janela de Vidro Temperado, fixa, fornecimento e instalação	1,0	0,0	0,0%	0,00	149,79
9.1.2	J 02 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	2,0	0,0	0,0%	0,00	553,36
9.1.3	J 03 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	1,0	0,0	0,0%	0,00	151,94
9.1.4	J 04 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	1,0	0,0	0,0%	0,00	316,86
9.1.5	J 05 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	5,0	0,0	0,0%	0,00	4.882,60
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO					1.050,65
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,42	0,0	0,0%	0,00	1.050,65
9.3	PORTAS DE VIDRO					2.581,78
9.3.1	Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P05 - 2,00 x 2,10 m)	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.232,17
9.3.2	Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P06 - 2,50 x 2,10 m)	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.349,61
9.4	PORTA DE MADEIRA					5.407,20
9.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,0	0,0	0,0%	0,00	768,92

Tasso Fernando C. C. C.
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RG

Proc. 1139120
Fis. 1750

Proc. 1139120
Fis. 1747

Proc. 1139120
Fis. 2047

Proc. 1139120
Fis. 141

9.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,0	0,0	0,0%	0,00	2.362,02
9.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,0	0,0	0,0%	0,00	805,94
9.4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,0	0,0	0,0%	0,00	1.470,32
9.5	PORTA E/OU TAMPA DE FERRO					707,61
9.5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,78	0,0	0,0%	0,00	707,61
10	PINTURAS					6.826,14
10.1	PINTURA DE PAREDES					6.784,91
10.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	663,18	0,0	0,0%	0,00	1.014,66
10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	177,9	0,0	0,0%	0,00	1.981,80
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	153,69	0,0	0,0%	0,00	2.322,25
10.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	153,69	0,0	0,0%	0,00	1.466,20
10.2	PINTURA PARA METAL					41,23
10.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	3,78	0,0	0,0%	0,00	41,23
11	GUARDA CORPO/ALAMBRADO					511,49
11.1	GUARDA CORPO DE FERRO					511,49
11.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	10,92	0,0	0,0%	0,00	511,49
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					10.853,51
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DOMICILIAR					2.166,25
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	21,0	0,0	0,0%	0,00	216,09
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	20,0	0,0	0,0%	0,00	241,60
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	14,0	0,0	0,0%	0,00	228,34
12.1.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,14	0,0	0,0%	0,00	63,30
12.1.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,76	0,0	0,0%	0,00	114,14
12.1.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	45,22	0,0	0,0%	0,00	1.302,78
12.2	CONEXÕES					1.079,77
12.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,0	0,0	0,0%	0,00	25,02
12.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	13,0	0,0	0,0%	0,00	64,09
12.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7,0	0,0	0,0%	0,00	46,97
12.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,0	0,0	0,0%	0,00	35,68
12.2.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,0	0,0	0,0%	0,00	3,03
12.2.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,0	0,0	0,0%	0,00	17,85
12.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,0	0,0	0,0%	0,00	20,60
12.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,0	0,0	0,0%	0,00	30,96
12.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,0	0,0	0,0%	0,00	3,06
12.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,0	0,0	0,0%	0,00	36,20
12.2.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	9,0	0,0	0,0%	0,00	88,20
12.2.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,0	0,0	0,0%	0,00	6,13

Tasso Fernando Guea
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139120
Fis. 751

Proc. 1139120
Fis. 2048

Proc. 1139120
Fis. 142

12.2.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,0	0,0	0,0%	0,00	25,00
12.2.14	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,0	0,0	0,0%	0,00	16,92
12.2.15	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,0	0,0	0,0%	0,00	152,34
12.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,0	0,0	0,0%	0,00	23,85
12.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,0	0,0	0,0%	0,00	87,84
12.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12,0	0,0	0,0%	0,00	141,48
12.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,0	0,0	0,0%	0,00	62,13
12.2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2,0	0,0	0,0%	0,00	22,26
12.2.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,0	0,0	0,0%	0,00	46,40
12.2.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,0	0,0	0,0%	0,00	74,76
12.2.23	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00	49,00
12.3	REGISTROS/VÁLVULAS					162,90
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	5,0	0,0	0,0%	0,00	162,90
12.4	RALOS/CAIXA SIFONADA					667,04
12.4.1	Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais.	5,0	0,0	0,0%	0,00	100,00
12.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,0	0,0	0,0%	0,00	290,48
12.4.3	Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada.	2,0	0,0	0,0%	0,00	276,56
12.5	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS					3.275,40
12.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	343,62
12.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	226,28
12.5.3	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	485,69
12.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	452,92
12.5.5	Vaso sanitário com Válvula de Descarga Metálica. Fornecimento e Instalação.	2,0	0,0	0,0%	0,00	895,04
12.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	404,64
12.5.7	Caixa Dagua em Polietileno 2000 Litros, com Tampa. Fornecido e Instalado	1,0	0,0	0,0%	0,00	467,21
12.6	FOSSA/SUMIDOUROS					3.502,15
12.6.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	1,0	0,0	0,0%	0,00	2.728,62
12.6.2	Sumidouro em Concreto Pré-moldado para 10 Contribuintes. Fornecimento e Instalação.	1,0	0,0	0,0%	0,00	773,53
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					12.963,46
13.1	ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS					1.486,53
13.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	250,89	0,0	0,0%	0,00	1.274,52
13.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,32	0,0	0,0%	0,00	39,68
13.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	7,81	0,0	0,0%	0,00	31,94
13.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	22,11	0,0	0,0%	0,00	140,39
13.2	FIOS/CABOS					3.928,24

Proc. 1139120
Fis. 1748

Tasso Fernando
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/R/O

Proc. 1139/20
Fis. 1752

Proc. 1139/20
Fis. 2049

Proc. 1139/20
Fis. 143

Proc. 1139/20
Fis. 1749

13.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	466,33	0,0	0,0%	0,00	848,72
13.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	496,05	0,0	0,0%	0,00	1.418,70
13.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,94	0,0	0,0%	0,00	426,18
13.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	115,82	0,0	0,0%	0,00	1.234,64
13.3	QUADROS/DISJUNTORES					2.085,17
13.3.1	Caixa de Proteção para Medidor Polifásico - Fornecimento e Instalação	1,0	0,0	0,0%	0,00	113,22
13.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,0	0,0	0,0%	0,00	337,22
13.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,0	0,0	0,0%	0,00	461,41
13.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00	16,38
13.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	5,84
13.3.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,0	0,0	0,0%	0,00	12,94
13.3.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	6,47
13.3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	7,28
13.3.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	26,27
13.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	6,0	0,0	0,0%	0,00	162,00
13.3.11	Disjuntor Tripolar 70A - Fornecimento e Instalação.	2,0	0,0	0,0%	0,00	112,42
13.3.12	Disjuntor Tripolar 80A - Fornecimento e Instalação	2,0	0,0	0,0%	0,00	115,36
13.3.13	Disjuntor Tripolar 100A - Fornecimento e Instalação.	1,0	0,0	0,0%	0,00	50,16
13.3.14	Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 80A, Tipo AC	2,0	0,0	0,0%	0,00	311,16
13.3.15	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175V, Corrente Máxima de *45*kA (Tipo AC)	4,0	0,0	0,0%	0,00	200,52
13.3.16	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175V, Corrente Máxima de *20*kA (Tipo AC)	4,0	0,0	0,0%	0,00	146,52
13.4	CAIXAS					948,31
13.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	3,0	0,0	0,0%	0,00	288,09
13.4.2	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	74,0	0,0	0,0%	0,00	354,46
13.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	56,0	0,0	0,0%	0,00	305,76
13.5	INTERRUPTOR/TOMADA					965,54
13.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,0	0,0	0,0%	0,00	115,20
13.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00	90,92
13.5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,0	0,0	0,0%	0,00	35,80
13.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,0	0,0	0,0%	0,00	167,72
13.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,0	0,0	0,0%	0,00	55,29
13.5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	33,0	0,0	0,0%	0,00	500,61
13.6	LUMINÁRIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS					674,88
13.6.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	74,0	0,0	0,0%	0,00	674,88
13.7	INSTALAÇÃO LÓGICA					1.035,14
13.7.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	84,89	0,0	0,0%	0,00	63,66
13.7.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	23,0	0,0	0,0%	0,00	555,22
13.7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	65,84	0,0	0,0%	0,00	300,88
13.7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15,19	0,0	0,0%	0,00	77,16
13.7.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,0	0,0	0,0%	0,00	38,22
13.8	TELEFONE					1.617,26

Tasso Fernando G. da
Engenheiro Civil
CREA: 13666-D/GO

Proc. 11391/20
 Fis. 1753

Proc. 11391/20
 Fis. 2050

Proc. 11391/20
 Fis. 1444

13.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,0	0,0	0,0%	0,00	128,11
13.8.2	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	175,39	0,0	0,0%	0,00	1.375,05
13.8.3	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	7,0	0,0	0,0%	0,00	114,10
13.9	SISTEMAS DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO					222,39
13.9.1	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	4,43	0,0	0,0%	0,00	86,91
13.9.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	3,0	0,0	0,0%	0,00	95,91
13.9.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	3,0	0,0	0,0%	0,00	39,57
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					574,12
14.1	INCÊNDIO					574,12
14.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,0	0,0	0,0%	0,00	194,36
14.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,0	0,0	0,0%	0,00	217,94
14.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	56,72
14.1.4	Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e Instalação.	10,0	0,0	0,0%	0,00	105,10
15	SERVIÇOS DIVERSOS					56.614,73
15.1	PISO CONCRETO (CALÇADA EXTERNA)					6.674,64
15.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	154,78	0,0	0,0%	0,00	5.921,88
15.1.2	Piso em ladrilho hidráulico 20x20 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento	13,8	0,0	0,0%	0,00	565,80
15.1.3	Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum (Piso Alerta)	4,56	0,0	0,0%	0,00	186,96
15.2	MEIO-FIO, LINHA D'ÁGUA E SARJETA					612,19
15.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	7,4	0,0	0,0%	0,00	196,54
15.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	15,0	0,0	0,0%	0,00	415,65
15.3	PINTURA PARA PISO					256,21
15.3.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	17,67	0,0	0,0%	0,00	256,21
15.4	PREPARO DO TERRENO					4.199,14
15.4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	75,0	0,0	0,0%	0,00	1.869,00
15.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	44,46	0,0	0,0%	0,00	2.330,14
15.5	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES (MURO EXTERNO)					9.748,93
15.5.1	CONCRETOS					4.172,89
15.5.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,22	0,0	0,0%	0,00	242,32
15.5.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	7,22	0,0	0,0%	0,00	1.921,81
15.5.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,62	0,0	0,0%	0,00	697,39
15.5.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	9,84	0,0	0,0%	0,00	1.311,37
15.5.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					4.849,67
15.5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	47,31	0,0	0,0%	0,00	3.318,79
15.5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	47,99	0,0	0,0%	0,00	1.530,88
15.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA					726,37
15.5.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	44,13	0,0	0,0%	0,00	726,37
15.6	ARMADURAS					3.949,56
15.6.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	90,73	0,0	0,0%	0,00	821,10
15.6.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	75,0	0,0	0,0%	0,00	592,50
15.6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	354,82	0,0	0,0%	0,00	2.469,54
15.6.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	11,09	0,0	0,0%	0,00	66,42
15.7	SUPERESTRUTURA (MURO EXTERNO)					5.757,94

Proc. 11391/2020
 Fis. 1750

Tasso Fernando
 Engenheiro Civil
 CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139120
Fis. 1754

Proc. 1137/2020
Fis. 2054

Proc. 1137/2020
Fis. 145

15.7.1	CONCRETOS					2.109,08
15.7.1.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,62	0,0	0,0%	0,00	697,39
15.7.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,36	0,0	0,0%	0,00	628,18
15.7.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,3	0,0	0,0%	0,00	79,85
15.7.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	5,28	0,0	0,0%	0,00	703,66
15.7.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					3.648,86
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS					
15.7.2.1	SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	54,09	0,0	0,0%	0,00	2.120,86
15.7.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	47,99	0,0	0,0%	0,00	1.528,00
15.8	ARMADURAS					3.153,33
15.8.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	120,64	0,0	0,0%	0,00	1.091,79
15.8.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	5,45	0,0	0,0%	0,00	43,05
15.8.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	157,09	0,0	0,0%	0,00	1.093,34
15.8.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	154,45	0,0	0,0%	0,00	925,15
15.9	PAREDES E PAINES					8.936,73
15.9.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS					8.936,73

Proc. 1137/2020
Fis. 1754

Tasso Fernando Vieira
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139120
Fis. 1755

Proc. 1139120
Fis. 2052

Proc. 1139120
Fis. 1752

15.9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	159,87	0,0	0,0%	0,00	8.936,73
15.10	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE					284,35
15.10.1	CHAPISCO					284,35
15.10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	121,0	0,0	0,0%	0,00	284,35
15.11	EMBOÇO					8.426,08
15.11.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	363,35	0,0	0,0%	0,00	8.426,08
15.12	PINTURAS					3.753,40
15.12.1	PINTURA DE PAREDES					3.753,40
15.12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	363,35	0,0	0,0%	0,00	555,92
15.12.1.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	363,35	0,0	0,0%	0,00	3.197,48
15.13	GRAMA INCLUSIVE PREPARO DO SOLO					671,38
15.13.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	88,69	0,0	0,0%	0,00	671,38
15.14	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					190,85
15.14.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	163,12	0,0	0,0%	0,00	190,85


	1ª Medição	2ª Medição
Porcentagem Executada	17,33%	14,08%
Porcentagem Acumulada	17,33%	31,41%
Valor Executado	R\$ 39.925,77	R\$ 32.446,51
Valor do BDI (28,82%)	R\$ 11.506,61	R\$ 9.351,08
Valor Executado c/ BDI	R\$ 51.432,38	R\$ 41.797,59
Valor Acumulado c/ BDI	R\$ 51.432,38	R\$ 93.229,97

Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020
PROCESSO Nº1139/2020

Figura 01 - EXECUÇÃO DE VERGAS, CONTRA VERGAS E PILARES.

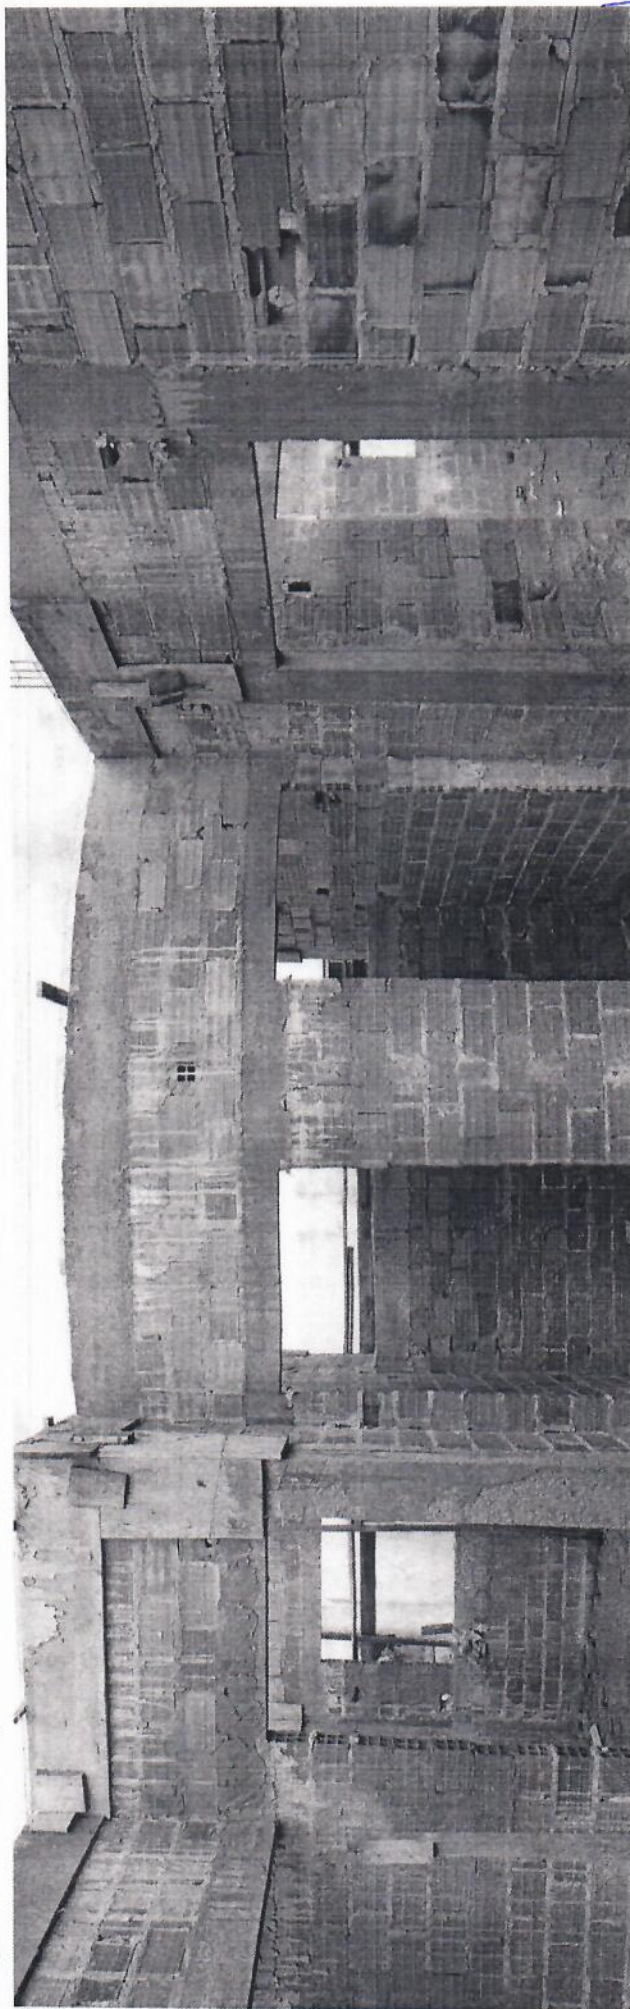

Proc. 1139/2020
Fis. 144

Proc. 1139/2020
Fis. 20513

Proc. 1139/2020
Fis. 1453

Proc. 1139/2020
Fis. 1756



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020
PROCESSO Nº1139/2020

Figura 02- EXECUÇÃO DE VERGAS, CONTRA VERGAS E ALVENARIAS



Proc. 1139/2020
Fis. 148

Proc. 1139/2020
Fis. 2054


Proc. 1139/2020
Fis. 1754

Proc. 1139/2020
Fis. 1757



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020
PROCESSO Nº1139/2020

Figura 03- EXECUÇÃO DA ALVENARIAS / VIGAS DE RESPALDOS

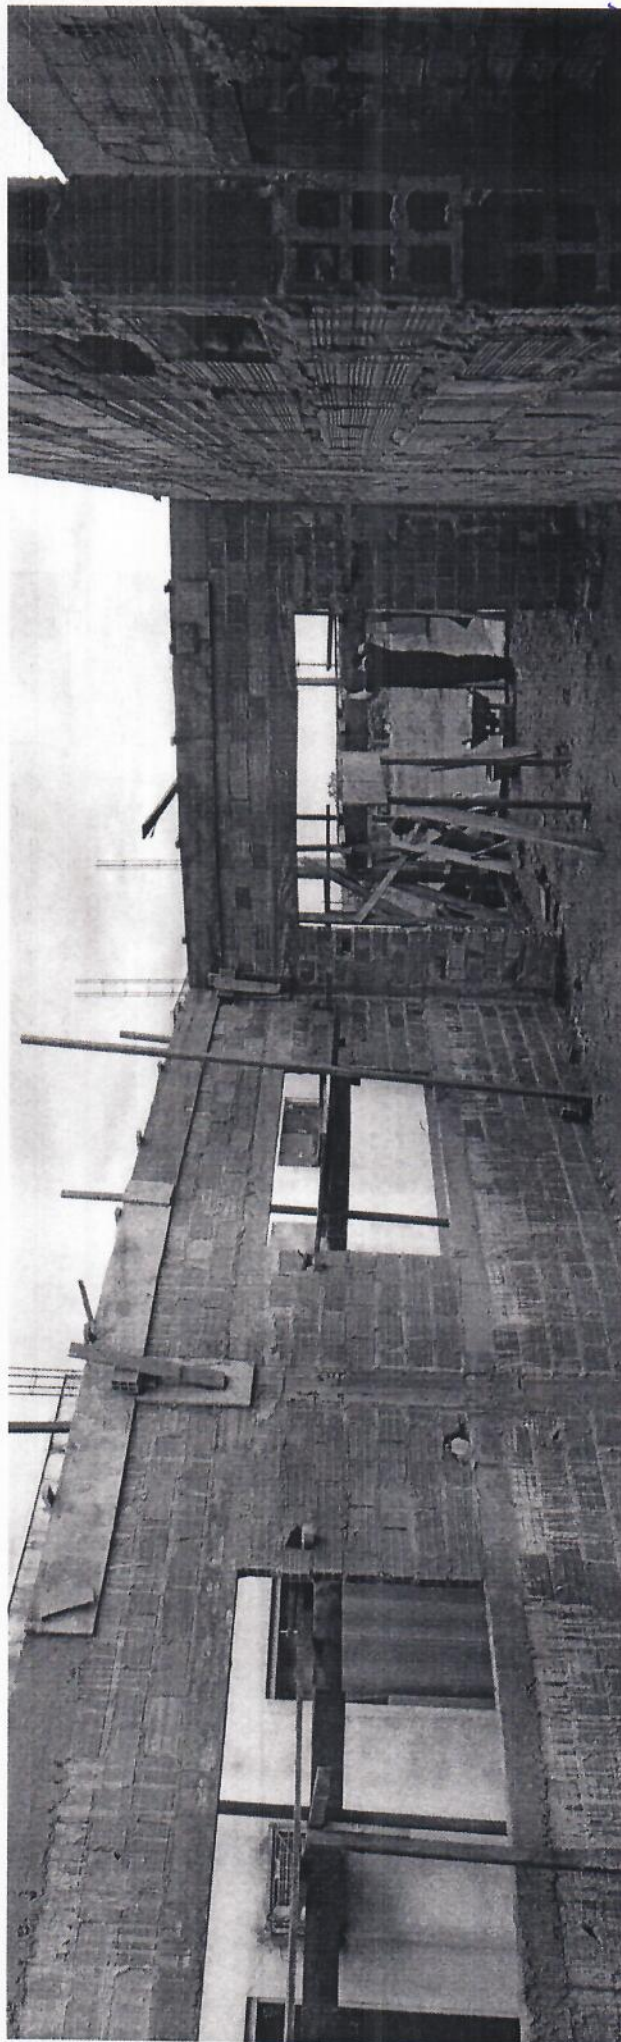

Proc. 1139/2020
Fis. 149

Proc. 1139/2020
Fis. 205



Proc. 1139/2020
Fis. 1755

Proc. 1139/2020
Fis. 1758



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020
PROCESSO Nº1139/2020

Figuras 04 e 05- EXECUÇÃO PILARES E VIGAS DE RESPALDOS.

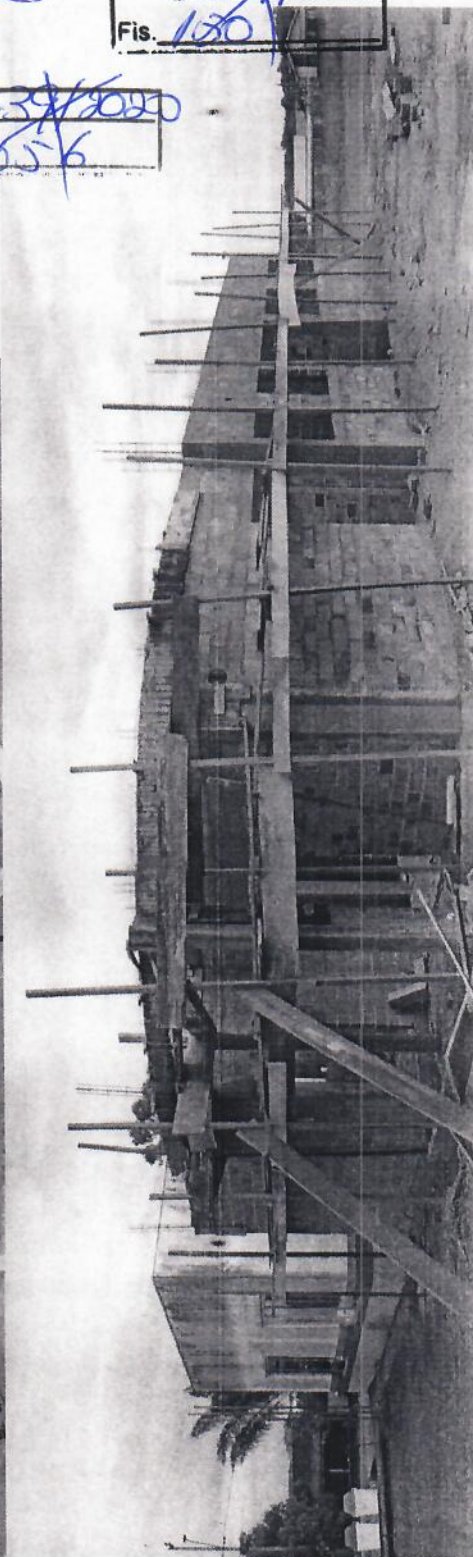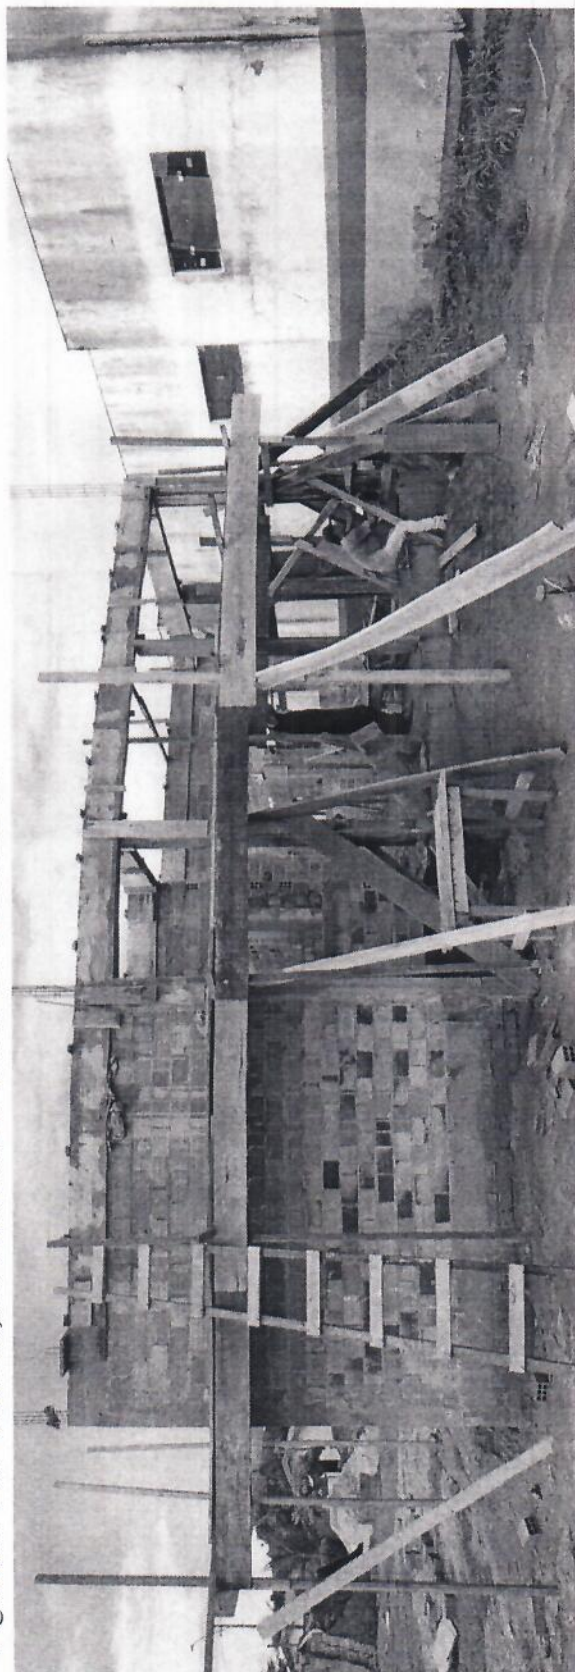

Proc. 1139/2020
Fis. 1759

Proc. 1139/2020
Fis. 1756

Proc. 1139/2020
Fis. 180

Proc. 1139/2020
Fis. 2056



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024

Proc. 1139/20
Fis. 1760

Proc. 1139/2020
Fis. 1757
Primavera
de Rondônia
Secretaria Municipal de Planejamento

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL N° 002/2021

Processo Administrativo nº1139-1/SEMAS/2020

Proc. 1139/20
Fis. 182

Aos 17 dias do mês de Março, do ano de dois mil e Vinte e Um, na cidade de Primavera de Rondônia/RO, o Assessor de Engenharia, nomeado através da portaria nº242/GP/2018, O Sr: Tasso Fernando Guedes e os membros da comissão de Fiscalização de Obras do Município de Primavera de Rondônia, devidamente nomeados através do Decreto nº 1994/GP/2020, composta pelos senhores, Ayrton Junior Nunes Moraes e Adeilson Pereira Ramos, atestam a Segunda medição da execução das obras das novas instalações do CRAS municipal, no município de Primavera de Rondônia. O senhor Adeilson Pereira Ramos, não pode se fazer presente para esta fiscalização por confronto de atividades laborais.

Referente à Solicitação da primeira medição.

I. Toda a Superestrutura encontra-se executada, bem como a alvenaria de vedação (sem chapisco e reboco).

II.

A Nota Fiscal certificada pelo responsável e vistada pelos responsáveis.

Segue

Memorial Fotográfico.

Ayrton Junior Nunes Moraes
Assessor especial

Tasso Fernando Guedes
Assessor de Engenharia

Adeilson Pereira Ramos
Div. Almoxarifado e patrimônio

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6

Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: sempplan@primavera.ro.gov.br

Fone: 3446-1139

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

PATRIMONIO

PATRIMONIO

Conta Corrente (Movimentações) Período de 24/05/2021 à 24/05/2021

Chapa: 5371

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

Proc. nº 1139/20
Fls. 194

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 24/05/2021 15:22

Sistema CECAM

Fornecedor: 101124 - EEJ SERVICOS LTDA - ME

Nota Fiscal: 695 - NFSE Dt. Aquisição: 25/03/2021 VI. Aquisição: 51.432,38 VI. Atual: 93.229,97

Local: 5 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data: 25/03/2021

Tipo Movto: Incorporação de Custo de

VI. Anterior: 0,00

VI. Atual: 51.432,38

VI. Movimento: 51.432,38

Observação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA . LOCALIZADO AO LADO DA PREFEITURA NOVA .

Proc. 1139/2020
Fls. 2060

Data: 24/05/2021

Tipo Movto: Incorporação de Custo de

VI. Anterior: 51.432,38

VI. Atual: 93.229,97

VI. Movimento: 41.797,59

Observação: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA . LOCALIAZO AO LADO DA PREFEITURA NOVA .

2 registros de movimentações

Valor Total : 93.229,97

1 Bens Patrimoniais

Valor Total : 93.229,97

Proc. 1139/2020
Fls. 1760Proc. 1139/20
Fls. 1763
