



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024

Proc. 1139/2020
Fis. 1785

Proc. 1139/2020
Fis. 2085

Primavera
de Rondônia
Tribuna com Desenvolvimento Social

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL N° 003/2021

Processo Administrativo n°1139-1/SEMAS/2020

Proc. 1139/2020
Fis. 178

Aos 09 dias do mês de Junho, do ano de dois mil e Vinte e Um, na cidade de Primavera de Rondônia/RO, o Assessor de Engenharia, nomeado através da portaria n°242/GP/2018, O Sr: Tasso Fernando Guedes e os membros da comissão de Fiscalização de Obras do Município de Primavera de Rondônia, devidamente nomeados através do Decreto n° 1994/GP/2020, composta pelos senhores, Ayrton Junior Nunes Moraes e Adeilson Pereira Ramos, atestam a Terceira medição da execução das obras das novas instalações do CRAS municipal, no município de Primavera de Rondônia. O senhor Adeilson Pereira Ramos, não pode se fazer presente para esta fiscalização por confronto de atividades laborais.

Referente à Solicitação da terceira medição.

Proc. 1139/2020
Fis. 1788

- I. Toda a Superestrutura encontra-se executada, bem como a alvenaria de vedação.
- II. A Obra encontra-se emboçada, chapiscada e rebocada.
- III. As instalações elétricas tem seus dutos locados.
- IV. A cobertura encontra-se executada

A Nota Fiscal certificada pelo responsável e vistada pelos responsáveis.

Segue

Memorial Fotográfico.

Ayrton Junior Nunes Moraes
Assessor especial

Tasso Fernando Guedes,
Assessor de Engenharia

Adeilson Pereira Ramos
Div. Almoxarifado e patrimônio

Proc. 1139120
Fis. 1790

Proc. 1139120
Fis. 1787

Proc. 1139120
Fis. 2087

Proc. 1139120
Fis. 18X

4.1	CONCRETOS					3.090,77	R\$ 0,00	R\$ 2.332,72	R\$ 758,73
4.1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,94	4,94	100,00%	1.266,96	1.266,96	0,00%	75,47%	24,54%
4.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,35	4,35	100,00%	1.115,64	1.115,64		90,08%	9,92%
4.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,8	1,8	100,00%	461,64	461,64		90,12%	9,88%
4.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	11,09	11,12	100,00%	247,19	246,53		8,37%	2,75%
4.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					7.919,94	R\$ 0,00	R\$ 7.128,02	R\$ 791,93
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	87,84	87,84	100,00%	3.444,20	3.444,20	0,00%	90,00%	9,99%
4.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	140,57	140,57	100,00%	4.475,74	4.475,74		90,00%	10,00%
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA					2.171,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.149,92
4.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	36,36	36	99,01%	2.149,92	2.171,41	0,00%	0,00%	99,01%
4.4	ARMADURAS					5.593,33	R\$ 0,00	R\$ 5.031,34	R\$ 562,02
4.4.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	202,55	202,55	100,00%	1.833,07	1.833,07	0,00%	89,95%	10,04%
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	75,73	75,73	100,00%	598,26	598,26		89,85%	10,15%
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	67,55	67,55	100,00%	470,14	470,14		88,16%	7,57%
4.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	306,91	306,91	100,00%	1.838,39	1.838,39		90,00%	10,00%
4.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	173,47	173,47	100,00%	853,47	853,47		90,00%	10,00%
4.5	CINTAS E VERGAS					1.384,81	R\$ 0,00	R\$ 1.380,71	R\$ 3,14
4.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,2	5,2	100,00%	81,69	81,69	0,00%	99,70%	0,22%
4.5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	18,95	18,9	99,74%	369,49	370,47		98,16%	3,84%
4.5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	5,2	5,2	100,00%	80,7	80,7		99,74%	0,22%
4.5.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	18,95	18,95	100,00%	343,75	343,75		99,74%	0,22%
4.5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	13,8	13,8	100,00%	349,14	349,14		99,74%	0,22%
4.5.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,1	5,1	100,00%	159,06	159,06		99,74%	0,22%
5	PAREDES E PAÍNES					18.535,88	R\$ 0,00	R\$ 12.974,95	R\$ 5.560,93
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS					18.535,88	R\$ 0,00	R\$ 12.974,95	R\$ 5.560,93
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	331,59	331,59	100,00%	18.535,88	18.535,88	0,00%	12,974,95	30,00%
6	CHAPISCO					12.417,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.884,21
6.1	CHAPISCO					1.558,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.558,47
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	663,18	663,18	100,00%	1.558,47	1.558,47	0,00%	0,00%	100,00%
6.2	EMBOÇO					7.045,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.325,74
6.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE PASTILHA, CERÂMICA, PLACA PRÉ MOLDADA E OUTROS	100,14	90	89,87%	2.012,40	2.239,13	0,00%	0,00%	89,79%
6.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS	207,24	186	89,75%	4.313,34	4.805,89			89,75%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS	100,14	0	0,00%	0	3.814,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Tasso Fernandes Siqueira
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139/2020
Fis. 1788

Proc. 1139/2020
Fis. 2086

Proc. 1139/2020
Fis. 180



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. 1139/2020
Fis. 1789

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
LOCAL: PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO

Planilha de Levantamento para Medição										
Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Valor Total	1ª Medição 15/03/2021	2ª Medição 26/04/2021	3ª Medição 26/05/2021	
1	ADMINISTRAÇÃO E NR-18					18.231,00	R\$ 9.655,47	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	
1.1	Administração e taxas					18.231,00	R\$ 9.655,47	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	
1.1.1	Administração e controle - (Visita técnica engenheiro)	4	3	75,00%	6.665,88	8.887,84	52,96%	15,67%	15,67%	
							1,0	1,0	1,0	
1.1.2	Taxas e Emolumentos- (ART)	1	1	100,00%	146,19	146,19	25,00%	25,00%	25,00%	
							1,0			
1.1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50 m x 2,00m)	3	3	100,00%	266,67	266,67	100,00%			
							3,0			
1.1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	4	3	75,00%	894,27	1.192,36	25,00%	25,00%	25,00%	
							1,0	1,0	1,0	
1.1.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	4	3	75,00%	1.015,38	1.353,84	25,00%	25,00%	25,00%	
							1,0	1,0	1,0	
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	6,25	6,25	100,00%	2.252,50	2.252,50	25,00%	25,00%	25,00%	
							6,25			
1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	12	12	100,00%	4.131,60	4.131,60	100,00%			
							12,0			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					14.317,83	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.1	PREPARO DO TERRENO					5.335,16	14.317,85	0,00%	0,00%	
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	55,6	55,6	100,00%	1.385,55	1.385,55	100,00%	0,00%	0,00%	
							55,6			
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	50,99	50,99	100,00%	2.672,38	2.672,38	100,00%			
							50,99			
2.1.3	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	40,19	40,19	100,00%	1.277,23	1.277,23	100,00%			
							40,19			
2.2	ATERRO COM OU SI/ COMPACTAÇÃO					8.982,67	R\$ 8.982,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.2.1	Execução e Compactação de Aterro com Solo Predominantemente Argiloso - Inclusive Solo, Carga e Transporte.	292,5	292,5	100,00%	8.982,67	8.982,67	100,00%	0,00%	0,00%	
							292,5			
3	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES					16.692,80	R\$	R\$ 740,34	R\$ 0,00	
3.1	CONCRETOS					4.391,91	15.952,53	4,43%	0,00%	
3.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,92	0,92	100,00%	182,73	182,73	100,00%	0,00%	0,00%	
							0,92			
3.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,69	5,69	100,00%	1.459,31	1.459,31	100,00%			
							5,69			
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,11	5,11	100,00%	1.310,56	1.310,56	100,00%			
							5,11			
3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	10,8	10,8	100,00%	1.439,31	1.439,31	100,00%			
							10,8			
3.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					6.322,88	R\$ 6.322,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	49,23	49,23	100,00%	3.453,48	3.453,48	100,00%	0,00%	0,00%	
							49,23			
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	89,95	89,95	100,00%	2.869,40	2.869,40	100,00%			
							89,95			
3.3	ARMADURAS					4.974,78	R\$ 4.974,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	133,09	133,09	100,00%	1.204,46	1.204,46	100,00%	0,00%	0,00%	
							133,09			
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	125,36	125,36	100,00%	990,34	990,34	100,00%			
							125,36			
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	117,27	117,27	100,00%	816,19	816,19	100,00%			
							117,27			
3.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	227,27	227,27	100,00%	1.361,34	1.361,34	100,00%			
							227,27			
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	122,45	122,45	100,00%	602,45	602,45	100,00%			
							122,45			
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA					1.003,23	R\$ 262,90	R\$ 740,34	R\$ 0,00	
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	60,95	60,95	100,00%	1.003,23	1.003,23	26,20%	73,79%	0,00%	
							15,9721	44,9779		
							26,21%	73,79%		
4	SUPERESTRUTURA					20.160,26	R\$ 0,00	R\$	R\$ 4.265,74	
							0,00%	15.872,79	21,15%	

Tasso Fernando
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139/20
Fis. 1791

Proc. 1139/20
Fis. 1758

Proc. 1139/20
Fis. 2088

Proc. 1139/20
Fis. 182

7	COBERTURA					8.049,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.714,06
7.1	MADEIRAMENTO					4.022,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.714,06
7.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	114,23	114,23	100,00%	886,42	886,42	0,00%	0,00%	R\$ 886,42
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO FORRO PVC	114,23	114	99,80%	827,64	829,3	0,00%	0,00%	R\$ 827,64
7.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO FORRO PVC	114,23	0	0,00%	0	2.306,30	0,00%	0,00%	R\$ 2.306,30
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	108,85	0	0,00%	0	2.649,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	CALHA METÁLICA					474,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	18,4	0	0,00%	0	474,72	0,00%	0,00%	0,00%
7.4	RUFO METÁLICO					903,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	42,9	0	0,00%	0	903,04	0,00%	0,00%	0,00%
8	PISO					17.855,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.1	LASTROS/FUNDAÇÕES DIVERSAS					6.803,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	163,12	0	0,00%	0	1.608,36	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	163,12	0	0,00%	0	5.195,37	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	PISO CERÂMICO					5.411,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	147,28	0	0,00%	0	5.411,06	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	RODAPÉ CERÂMICO					511,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	120,83	0	0,00%	0	511,11	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	PISO CONCRETO (CALÇADA INTERNA)					5.129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	134,08	0	0,00%	0	5.129,90	0,00%	0,00%	0,00%
9	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					15.801,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	JANELA VIDRO TEMPERADO					6.054,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.1	J-01. Janela de Vidro Temperado, fixa, fornecimento e instalação	1	0	0,00%	0	149,79	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.2	J 02 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	2	0	0,00%	0	553,36	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.3	J 03 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	1	0	0,00%	0	151,94	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.4	J 04 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	1	0	0,00%	0	316,86	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.5	J 05 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	5	0	0,00%	0	4.882,60	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	JANELA DE ALUMINIO					1.050,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,42	0	0,00%	0	1.050,65	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	PORTAS DE VIDRO					2.581,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.1	Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P05 - 2,00 x 2,10 m)	1	0	0,00%	0	1.232,17	0,00%	0,00%	0,00%
9.3.2	Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P06 - 2,50 x 2,10 m)	1	0	0,00%	0	1.349,61	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	PORTA DE MADEIRA					5.407,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	2	0	0,00%	0	768,92	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	6	0	0,00%	0	2.362,02	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	2	0	0,00%	0	805,94	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	4	0	0,00%	0	1.470,32	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	PORTA E/OU TAMPA DE FERRO					707,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,78	0	0,00%	0	707,61	0,00%	0,00%	0,00%

Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

12.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12	0	0,00%	0	141,48			
12.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3	0	0,00%	0	62,13			
12.2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2	0	0,00%	0	22,26			
12.2.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5	0	0,00%	0	46,4			
12.2.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4	0	0,00%	0	74,76			
12.2.23	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5	0	0,00%	0	49			
12.3	REGISTROS/VÁLVULAS					162,9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	5	0	0,00%	0	162,9	0,00%	0,00%	0,00%
12.4	RALOS/CAIXA SIFONADA					667,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.4.1	Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais.	5	0	0,00%	0	100	0,00%	0,00%	0,00%
12.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2	0	0,00%	0	290,48			
12.4.3	Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada.	2	0	0,00%	0	276,56			
12.5	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS					3.275,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO	2	0	0,00%	0	343,62	0,00%	0,00%	0,00%
12.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,	2	0	0,00%	0	226,28			
12.5.3	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/	1	0	0,00%	0	485,69			
12.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2	0	0,00%	0	452,92			
12.5.5	Vaso sanitário com Válvula de Descarga Metálica. Fornecimento e Instalação.	2	0	0,00%	0	895,04			
12.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	0	0,00%	0	404,64			
12.5.7	Caixa Dagua em Polietileno 2000 Litros, com Tampa. Fornecido e Instalado	1	0	0,00%	0	467,21			
12.6	FOSSA/SUMIDOUROS					3.502,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.6.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	1	0	0,00%	0	2.728,62	0,00%	0,00%	0,00%
12.6.2	Sumidouro em Concreto Pré-moldado para 10 Contribuintes. Fornecimento e Instalação.	1	0	0,00%	0	773,53			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					12.963,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.045,76
13.1	ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS					1.486,53	0,00%	0,00%	15,78%
13.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	250,89	250,89	100,00%	1.274,52	1.274,52	0,00%	0,00%	R\$ 1.314,21
13.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,32	6,32	100,00%	39,68	39,68	0,00%	0,00%	88,40%
13.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	7,81	0	0,00%	0	31,94	0,00%	0,00%	250,89
13.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	22,11	0	0,00%	0	140,39			R\$ 1.274,52
13.2	FIOS/CABOS					3.928,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
13.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	466,33	0	0,00%	0	848,72	0,00%	0,00%	6,32
13.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	496,05	0	0,00%	0	1.418,70			R\$ 39,68
13.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,94	0	0,00%	0	426,18			100,00%
13.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	115,82	0	0,00%	0	1.234,64			
13.3	QUADROS/DISJUNTORES					2.085,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.3.1	Caixa de Proteção para Medidor Polifásico - Fornecimento e Instalação	1	0	0,00%	0	113,22	0,00%	0,00%	0,00%
13.3.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	1	0	0,00%	0	337,22			

Proc. 1139/2020
Fis. 790

Proc. 1139/2020
Fis. 184

Proc. 1139/2020
Fis. 2090

Proc. 1139/2020
Fis. 793

Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA 13666 D/RO

Proc. 1139/2020
 Fis. 1794

Proc. 1139/20
 Fis. 185

Proc. 1139/2020
 Fis. 2094

Proc. 1139/20
 Fis. 1794

13.3.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	1	0	0,00%	0	481,41			
13.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	3	0	0,00%	0	16,38			
13.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	1	0	0,00%	0	5,84			
13.3.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	2	0	0,00%	0	12,94			
13.3.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	1	0	0,00%	0	6,47			
13.3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	1	0	0,00%	0	7,28			
13.3.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	1	0	0,00%	0	26,27			
13.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	6	0	0,00%	0	162			
13.3.11	Disjuntor Tripolar 70A - Fornecimento e instalacao.	2	0	0,00%	0	112,42			
13.3.12	Disjuntor Tripolar 80A - Fornecimento e instalacao	2	0	0,00%	0	115,36			
13.3.13	Disjuntor Tripolar 100A - Fornecimento e instalacao.	1	0	0,00%	0	50,16			
13.3.14	Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 80A, Tipo AC	2	0	0,00%	0	311,16			
13.3.15	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *45*ka (Tipo AC)	4	0	0,00%	0	200,52			
13.3.16	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *20*ka (Tipo AC)	4	0	0,00%	0	146,52			
13.4	CAIXAS					948,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,46
13.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	3	0	0,00%	0	288,09	0.00%	0.00%	37.37%
13.4.2	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	74	74	100,00%	354,46	354,46			74,0 R\$ 354,46 100,00%
13.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	56	0	0,00%	0	305,76			
13.5	INTERRUPTOR/TOMADA					965,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	8	0	0,00%	0	115,2	0.00%	0.00%	0.00%
13.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	4	0	0,00%	0	90,92			
13.5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	2	0	0,00%	0	35,8			
13.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	7	0	0,00%	0	167,72			
13.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	3	0	0,00%	0	55,29			
13.5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	33	0	0,00%	0	500,61			
13.6	LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS					674,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.6.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	74	0	0,00%	0	674,88	0.00%	0.00%	0.00%
13.7	INSTALACAO LÓGICA					1.035,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,09
13.7.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	84,89	0	0,00%	0	63,66	0.00%	0.00%	36.42%
13.7.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	23	0	0,00%	0	555,22			
13.7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	65,84	65,84	100,00%	300,88	300,88			65,84 R\$ 300,88 100,00%
13.7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	15,19	15	98,75%	76,2	77,16			15,0 R\$ 76,20 98,76%
13.7.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	7	0	0,00%	0	38,22			
13.8	TELEFONE					1.617,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	1	0	0,00%	0	128,11	0.00%	0.00%	0.00%

Tasso Fernando Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139/20
Fis. 1795

Proc. 1139/2020
Fis. 1792

Proc. 1139/2020
Fis. 2092

Proc. 1139/20
Fis. 186

13.8.2	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	175,39	0	0,00%	0	1.378,09			
13.8.3	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	7	0	0,00%	0	114,1			
13.9	SISTEMAS DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO					222,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.9.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	4,43	0	0,00%	0	86,91	0,00%	0,00%	0,00%
13.9.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	3	0	0,00%	0	95,91			
13.9.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	3	0	0,00%	0	39,57			
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					574,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1	INCÊNDIO					574,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2	0	0,00%	0	194,36	0,00%	0,00%	0,00%
14.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2	0	0,00%	0	217,94			
14.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4	0	0,00%	0	56,72			
14.1.4	Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e Instalação.	10	0	0,00%	0	105,1			
15	SERVIÇOS DIVERSOS					56.614,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.1	PISO CONCRETO (CALÇADA EXTERNA)					6.674,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	154,78	0	0,00%	0	5.921,88	0,00%	0,00%	0,00%
15.1.2	Piso em ladrilho hidráulico 20x20 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento	13,8	0	0,00%	0	565,8			
15.1.3	Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum (Piso Alerta)	4,56	0	0,00%	0	186,96			
15.2	MEIO-FIO, LINHA D'AGUA E SARJETA					612,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	7,4	0	0,00%	0	196,54	0,00%	0,00%	0,00%
15.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	15	0	0,00%	0	415,65			
15.3	PINTURA PARA PISO					256,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.3.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	17,67	0	0,00%	0	256,21	0,00%	0,00%	0,00%
15.4	PREPARO DO TERRENO					4.199,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	75	0	0,00%	0	1.869,00	0,00%	0,00%	0,00%
15.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	44,46	0	0,00%	0	2.330,14			
15.5	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES (MURO EXTERNO)					9.748,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.5.1	CONCRETOS					4.172,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.5.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,22	0	0,00%	0	242,32	0,00%	0,00%	0,00%
15.5.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	7,22	0	0,00%	0	1.921,81			
15.5.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,62	0	0,00%	0	697,39			
15.5.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	9,84	0	0,00%	0	1.311,37			
15.5.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					4.849,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	47,31	0	0,00%	0	3.318,79	0,00%	0,00%	0,00%
15.5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	47,99	0	0,00%	0	1.530,88			
15.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA					726,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.5.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	44,13	0	0,00%	0	726,37	0,00%	0,00%	0,00%
15.6	ARMADURAS					3.949,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.6.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	90,73	0	0,00%	0	821,1	0,00%	0,00%	0,00%
15.6.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	75	0	0,00%	0	592,5			

Tasso Fernando
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139/20
Fis. 1796

Proc. 1139/20
Fis. 1793

Proc. 1139/20
Fis. 2092

Proc. 1139/20
Fis. 187

15.6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	394,82	0	0,00%	0	2.469,54			
15.6.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	11,09	0	0,00%	0	66,42			
15.7	SUPERESTRUTURA (MURO EXTERNO)					5.757,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.7.1	CONCRETOS					2.109,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.7.1.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,82	0	0,00%	0	697,39	0,00%	0,00%	0,00%
15.7.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,36	0	0,00%	0	628,18			
15.7.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,3	0	0,00%	0	79,85			
15.7.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	5,28	0	0,00%	0	703,66			
15.7.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS					3.648,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	54,09	0	0,00%	0	2.120,86	0,00%	0,00%	0,00%
15.7.2.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	47,99	0	0,00%	0	1.528,00			
15.8	ARMADURAS					3.153,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.8.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	120,64	0	0,00%	0	1.091,79	0,00%	0,00%	0,00%
15.8.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	5,45	0	0,00%	0	43,05			
15.8.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	157,09	0	0,00%	0	1.093,34			
15.8.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	154,45	0	0,00%	0	925,15			
15.9	PAREDES E PAÍNES					8.936,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.9.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS					8.936,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	159,87	0	0,00%	0	8.936,73	0,00%	0,00%	0,00%
15.10	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE					284,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.10.1	CHAPISCO					284,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	121	0	0,00%	0	284,35	0,00%	0,00%	0,00%
15.11	EMBOÇO					8.426,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.11.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE PINTURAS	363,35	0	0,00%	0	8.426,08	0,00%	0,00%	0,00%
15.12	PINTURA DE PAREDES					3.753,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.12.1	PINTURA DE PAREDES					3.753,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	363,35	0	0,00%	0	555,92	0,00%	0,00%	0,00%
15.12.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	363,35	0	0,00%	0	3.197,48			
15.13	GRAMA INCLUSIVE PREPARO DO SOLO					671,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.13.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	88,69	0	0,00%	0	671,38	0,00%	0,00%	0,00%
15.14	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS					190,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.14.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	163,12	0	0,00%	0	190,85	0,00%	0,00%	0,00%

	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição
Porcentagem Executada	17,33%	14,08%	10,56%
Porcentagem Acumulada	17,33%	31,41%	41,97%
Valor Executado	R\$ 39.925,77	R\$ 32.446,51	R\$ 24.329,16
Valor do BDI (28,82%)	R\$ 11.506,61	R\$ 9.351,08	R\$ 7.011,66
Valor Executado c/ BDI	R\$ 51.432,38	R\$ 41.797,59	R\$ 31.340,82
Valor Acumulado c/ BDI	R\$ 51.432,38	R\$ 93.229,97	R\$ 124.570,80

Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO



PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020

PROCESSO Nº1139/2020 – 3ª MEDIÇÃO

Figura 01- EXECUÇÃO DE REBOCO E DISTRIBUIÇÃO DOS CONDUITES PARTE ELÉTRICA.


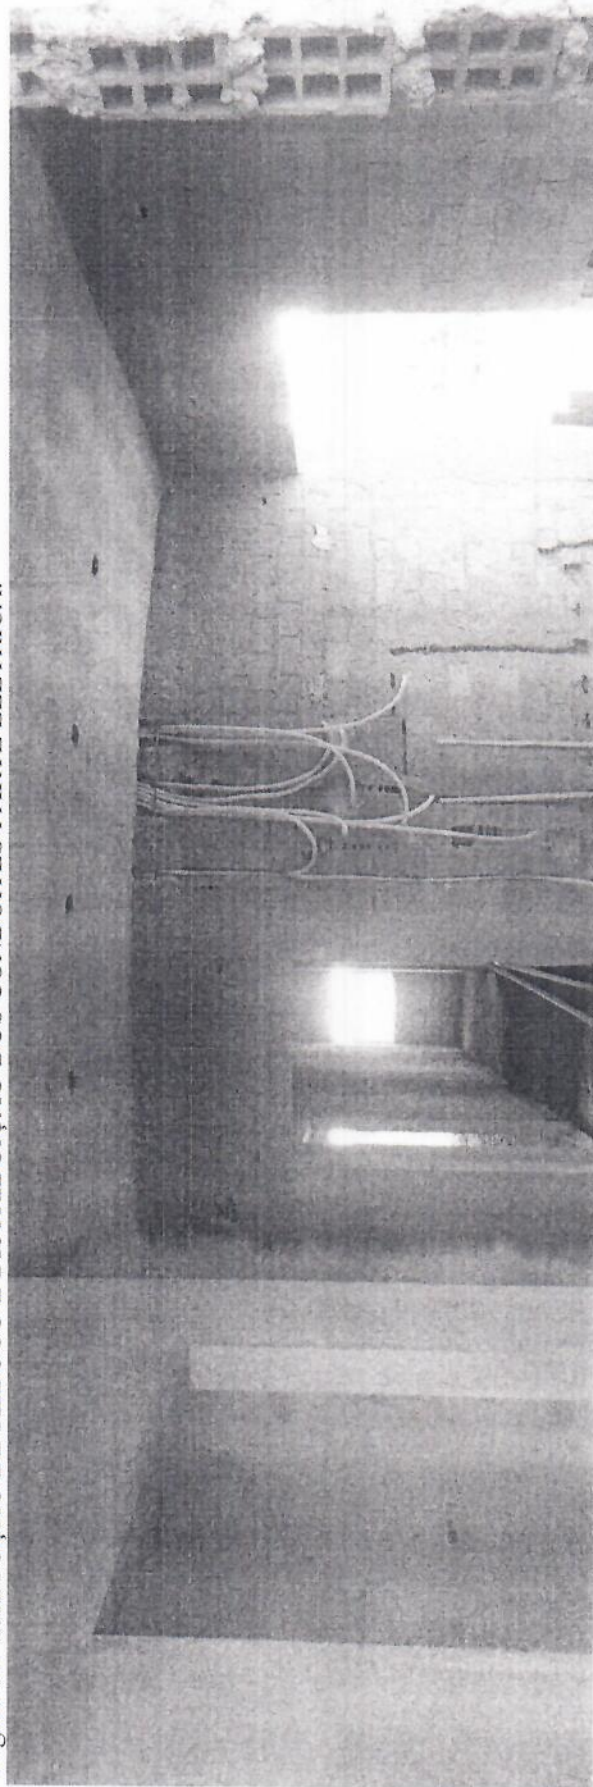


Figura 02- EXECUÇÃO DE REBOCO PARTE INTERNA DAS SALAS.

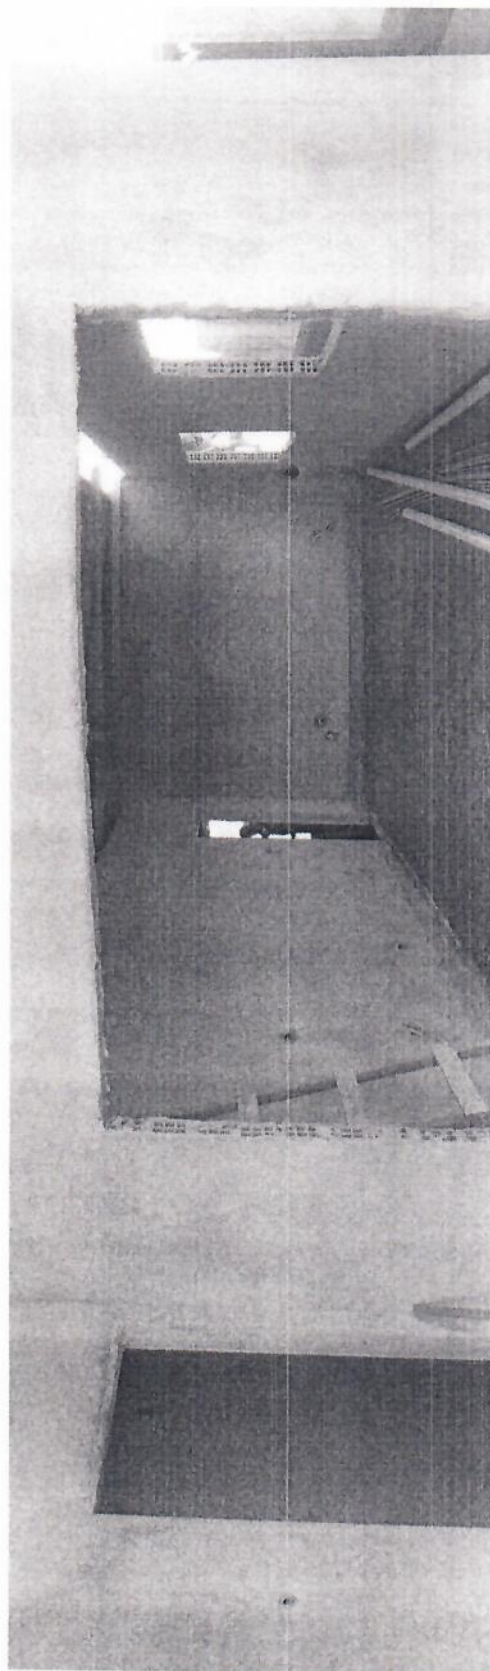

Proc. 1139/20
Fis. 1797

Proc. 1139/2020
Fis. 1794

Proc. 1139/20
Fis. 188

Proc. 1139/2020
Fis. 2094



PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020

PROCESSO Nº1139/2020 – 3ª MEDIÇÃO

Figura 03- EXECUÇÃO DE REBOCO NA PARTE INTERNA DA SALAS.


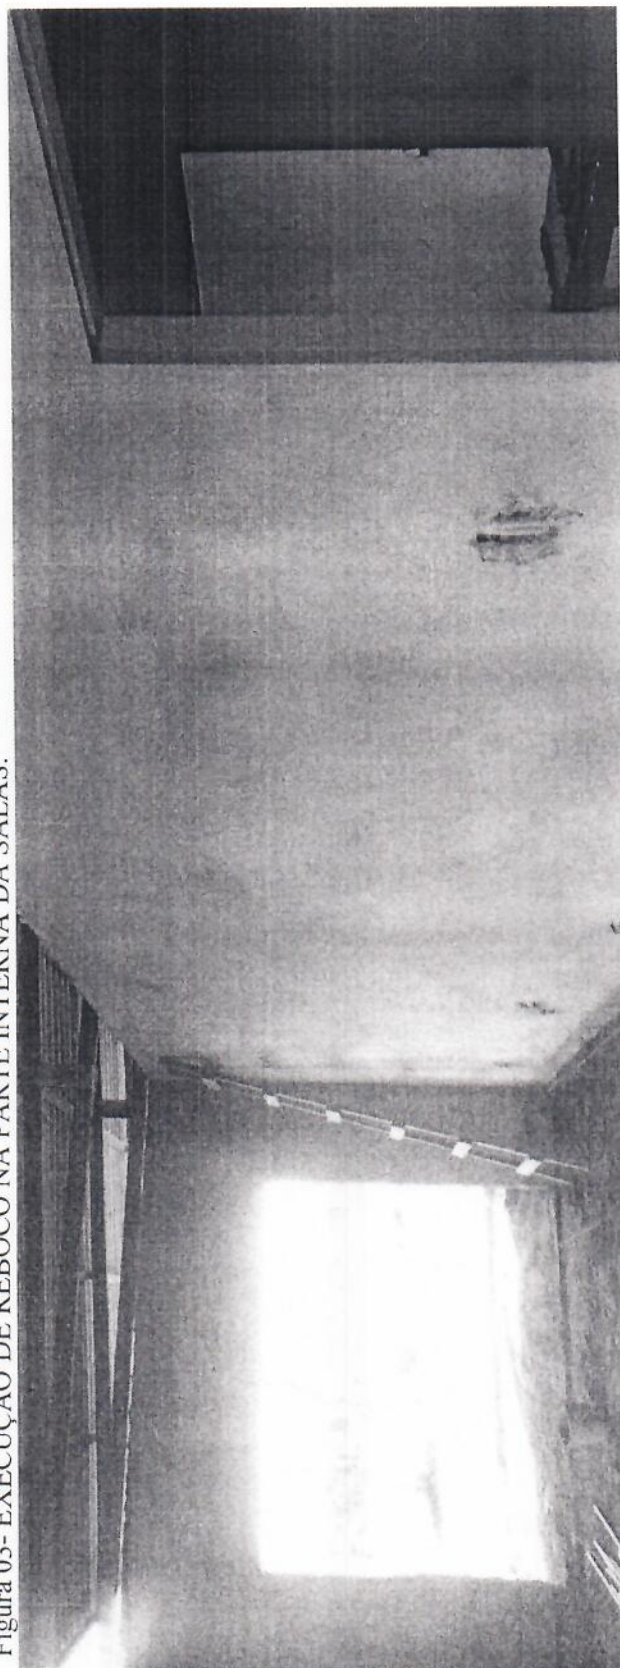


Figura 04- EXECUÇÃO DE REBOCO PARTE INTERNA DA ÁREA.

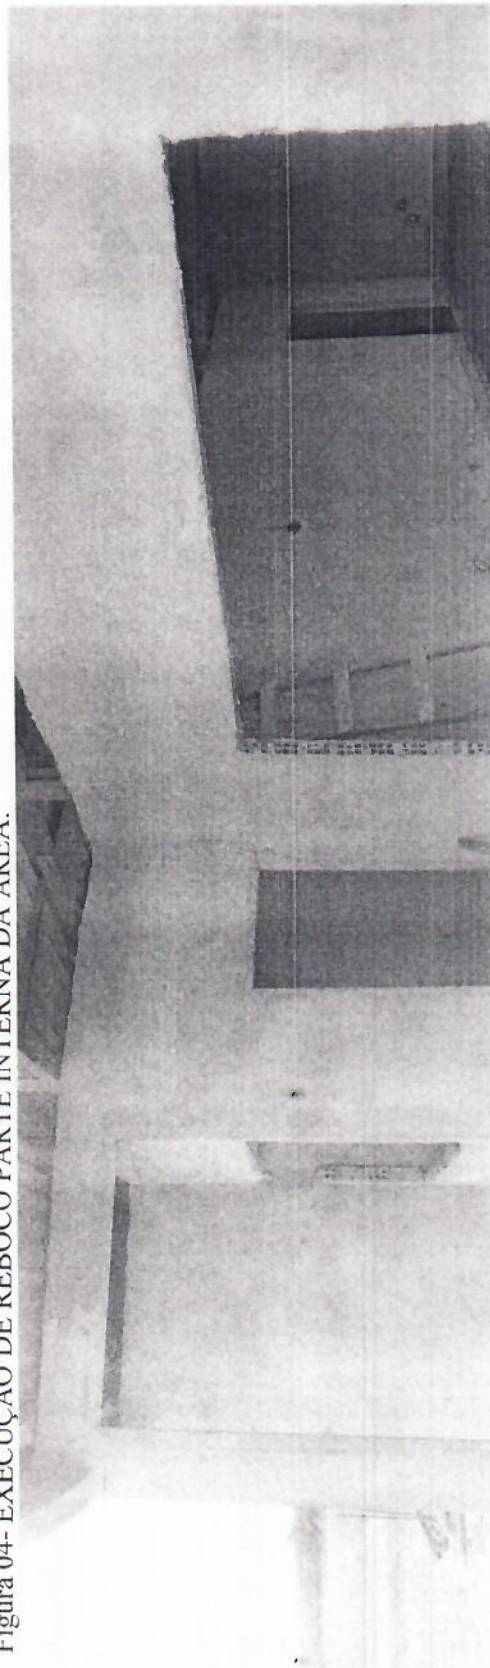

Proc. 1139/2020
Fis. 1795

Proc. 1139/2020
Fis. 187

Proc. 1139/2020
Fis. 1798

Proc. 1139/2020
Fis. 2095



PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONVÊNIO 148/PGE/2020
PROCESSO Nº1139/2020 – 3ª MEDIÇÃO

Figura 05- EXECUÇÃO DE REBOCO NA PARTE EXTERNA (FACHADA LATERAL).


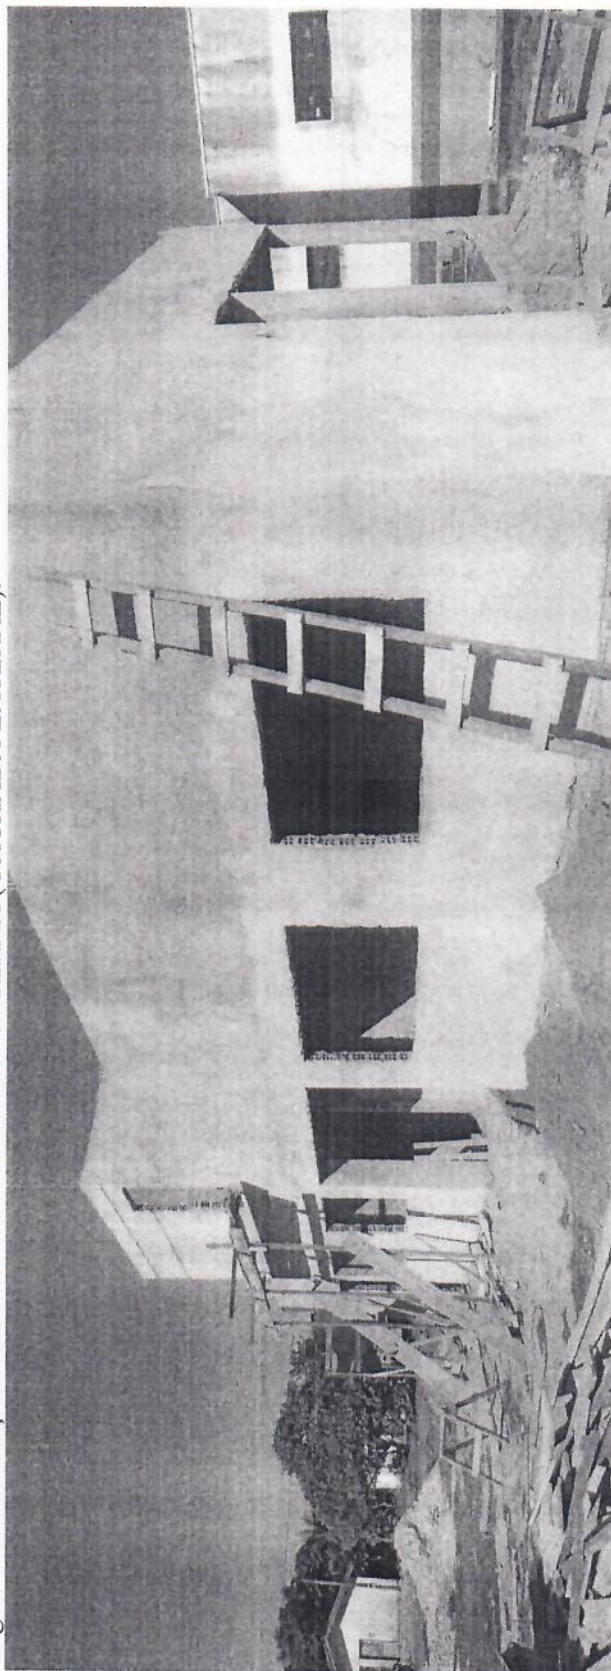


Figura 06- EXECUÇÃO DE REBOCO PARTE EXTERNA (FACHADA FRONTAL)

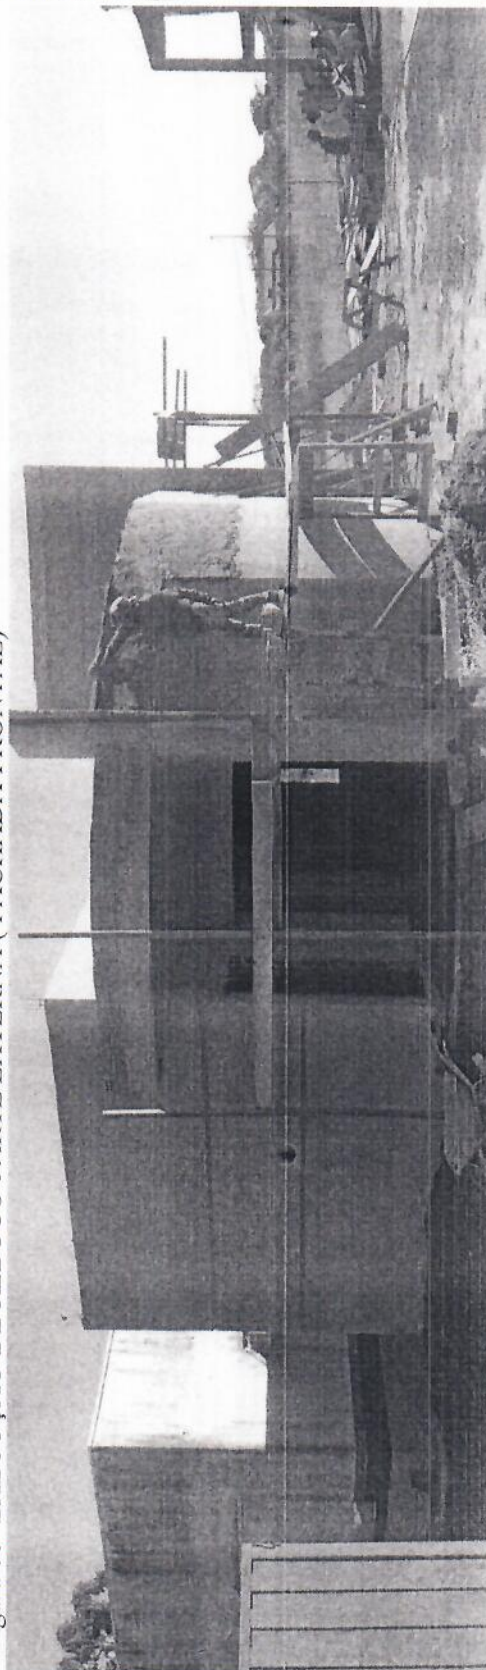

Proc. 1139/2020
Fis. 1796

Proc. 1139/2020
Fis. 190

Proc. 1139/2020
Fis. 1799

Proc. 1139/2020
Fis. 2098

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

PATRIMONIO

PATRIMONIO

Conta Corrente (Movimentações) Período de 16/06/2021 à 24/05/2021

Proc. 1139/2020
Fis. 1789

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 16/06/2021 13:23

Sistema CECAM

Chapa: 5371 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

Fornecedor: 101124 - EEJ SERVICOS LTDA - ME

Nota Fiscal: 695 - NFSE **Dt. Aquisição:** 25/03/2021 **VI. Aquisição:** 51.432,38 **VI. Atual:** 124.570,79

Local: 5 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data: 25/03/2021 **Tipo Movto:** Incorporação de Custo de
VI. Anterior: 0,00 **VI. Atual:** 51.432,38 **VI. Movimento:** 51.432,38
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA . LOCALIZADO AO LADO DA PREFEITURA NOVA .

Proc. 1139/2020
Fis. 1789

Data: 24/05/2021 **Tipo Movto:** Incorporação de Custo de
VI. Anterior: 51.432,38 **VI. Atual:** 93.229,97 **VI. Movimento:** 41.797,59
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA . LOCALIAZO AO LADO DA PREFEITURA NOVA .

Data: 16/06/2021 **Tipo Movto:** Incorporação de Custo de
VI. Anterior: 93.229,97 **VI. Atual:** 124.570,79 **VI. Movimento:** 31.340,82
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

Proc. 1139/2020
Fis. 1.802

3 registros de movimentações

Valor Total : 124.570,79

1 Bens Patrimoniais

Valor Total : 124.570,79
