



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
01

Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA	Contrato : 018/2025	BDI : 24,20%	Data Medição : 25/09/2025
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025	Data Base OS : 05/08/2025		Ref. Período : 05/08/2025 a 25/09/2025
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA	Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00		Vencimento : Conforme o contrato
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	Valor desta Medição : 35.819,45		Saldo Contratual : R\$ 77.080,55

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.138,54						
1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS C/ SUPORTE E TRAVESSA	M2	8,00	262,18	325,62	2.604,96	0%	100%	0%	-	2.604,96	-
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	115,86	0,27	0,34	39,39	0%	100%	0%	-	39,39	-
1.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	65,36	104,64	129,96	8.494,19	0%	20%	80%	-	1.698,84	6.795,35
										-	-	-
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 24.526,41						
2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO E ENCARREGADO DE OBRAS)	MÊS	3,00	6.582,50	8.175,47	24.526,41	0%	33,00%	67,00%	-	8.093,72	16.432,69
										-	-	-
3.0	INFRAESTRUTURA					R\$ 8.619,44						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,61	53,09	65,94	172,10	0%	100%	0%	-	172,10	-
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,75	40,36	50,13	338,38	0%	100%	0%	-	338,38	-
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	17,02	54,69	67,92	1.156,00	0%	100%	0%	-	1.156,00	-
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,00	11,33	14,07	703,50	0%	100%	0%	-	703,50	-
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00	13,45	16,70	33,40	0%	100%	0%	-	33,40	-
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,91	708,61	880,09	1.680,97	0%	100%	0%	-	1.680,97	-
3.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,03	469,66	583,32	1.184,14	0%	100%	0%	-	1.184,14	-
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,56	40,44	50,23	1.032,73	0%	100%	0%	-	1.032,73	-
3.9	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM FORN.DE MATERIAL.	M3	24,62	75,81	94,16	2.318,22	0%	100%	0%	-	2.318,22	-
4.0	SUPERESTRUTURA					R\$ 14.657,35						
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	13,60	76,32	94,79	1.289,14	0%	50%	50%	-	644,57	644,57
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	14,48	101,15	125,63	1.819,12	0%	50%	50%	-	909,56	909,56
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	259,00	10,60	13,17	3.411,03	0%	100%	0%	-	3.411,03	-

Leandro Costa

Diego Lourenço





BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
01

Contratado :	MJ ENGENHARIA LTDA	Contrato :	018/2025	BDI	24,20%	Data Medição :	25/09/2025
Tipo :	CONCORRÊNCIA 03/2025	Data Base OS :	05/08/2025			Ref. Período :	05/08/2025 a 25/09/2025
Objeto :	CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA	Valor do Contrato (R\$) :	112.900,00			Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	Valor desta Medição :	35.819,45			Saldo Contratual :	R\$ 77.080,55

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00	13,45	16,70	1.469,60	0%	100%	0%	-	1.469,60	-
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,00	11,59	14,39	1.179,98	0%	100%	0%	-	1.179,98	-
4.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,33	793,22	985,18	3.280,65	0%	50%	50%	-	1.640,33	1.640,33
4.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00	72,90	90,54	1.086,48	0%	0%	100%	-	-	1.086,48
4.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,00	68,74	85,37	1.024,44	0%	0%	100%	-	-	1.024,44
4.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	55,73	69,22	96,91	0%	0%	100%	-	-	96,91
5.0	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 11.725,45						
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	87,18	67,83	84,24	7.344,04	0%	75%	25%	-	5.508,03	1.836,01
5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,74	538,88	669,29	1.164,56	0%	0%	100%	-	-	1.164,56
5.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,36	594,05	737,81	3.216,85	0%	0%	100%	-	-	3.216,85
6.0	COBERTURA E FORRO					R\$ 15.964,35						
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	886,34	1.100,83	4.403,32	0%	0%	100%	-	-	4.403,32
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,24	13,43	16,68	1.271,68	0%	0%	100%	-	-	1.271,68
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,24	35,35	43,90	3.346,94	0%	0%	100%	-	-	3.346,94
6.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,80	63,23	78,53	769,59	0%	0%	100%	-	-	769,59

Leandro A Costa

Diego Lourenço

Arquivo : 1ª Medição sala de aula querencia / Pasta : MED 01



Proc 2081-1/2024
Fls. 612

							BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO			Apropriação PARCIAL		Medição nº 01	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA			Contrato : 018/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 25/09/2025						
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025			Data Base OS : 05/08/2025		Ref. Período : 05/08/2025 a 25/09/2025								
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA			Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00		Vencimento : Conforme o contrato								
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 35.819,45		Saldo Contratual : R\$ 77.080,55								
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
6.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	71,90	59,04	73,33	5.272,43	0%	0%	100%	-	-	5.272,43	
6.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	M	89,68	8,08	10,04	900,39	0%	0%	100%	-	-	900,39	
7.0	PISOS E REVESTIMENTOS					R\$ 9.532,36							
7.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	M2	59,64	80,74	100,28	5.980,70	0%	0%	100%	-	-	5.980,70	
7.2	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF 09/2020	M	28,36	11,31	14,05	398,46	0%	0%	100%	-	-	398,46	
7.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	2,95	443,13	550,36	1.623,56	0%	0%	100%	-	-	1.623,56	
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	1,68	733,10	910,50	1.529,64	0%	0%	100%	-	-	1.529,64	
8.0	ESQUADRIAS					R\$ 8.671,58							
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	843,90	1.048,12	1.048,12	0%	0%	100%	-	-	1.048,12	
8.2	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM 4 FOLHAS (M2)	M2	9,60	639,38	794,11	7.623,46	0%	0%	100%	-	-	7.623,46	
9.0	ELETRICAS					R\$ 2.976,38							
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	54,20	1,91	2,37	128,45	0%	0%	100%	-	-	128,45	
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	47,80	8,63	10,72	512,42	0%	0%	100%	-	-	512,42	
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	124,10	2,86	3,55	440,56	0%	0%	100%	-	-	440,56	
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75,40	4,55	5,65	426,01	0%	0%	100%	-	-	426,01	
9.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	38,15	47,38	47,38	0%	0%	100%	-	-	47,38	
9.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	26,26	32,61	195,66	0%	0%	100%	-	-	195,66	

Leandro A. Costa

[Assinatura]

Diego Longo

Arquivo : 1ª Medição sala de aula querencia / Pasta : MED 01



Proc 2081-1/2024
Fls. 613

										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO			Apropriação PARCIAL		Medição nº 01	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA			Contrato :		018/2025		BDI		24,20%		Data Medição :		25/09/2025			
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025			Data Base OS :		05/08/2025						Ref. Período :		05/08/2025 a 25/09/2025			
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA			Valor do Contrato (R\$) :		112.900,00						Vencimento :		Conforme o contrato			
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição :		35.819,45						Saldo Contratual :		R\$ 77.080,55			
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)						
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO				
9.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,64	49,23	98,46	0%	0%	100%	-	-	98,46				
9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	8,65	10,74	21,48	0%	0%	100%	-	-	21,48				
9.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	45,79	56,86	113,72	0%	0%	100%	-	-	113,72				
9.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	48,68	60,45	60,45	0%	0%	100%	-	-	60,45				
9.11	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TIPO AC)	UN	3,00	78,02	96,89	290,67	0%	0%	100%	-	-	290,67				

Leandro A. Costa

Cláudio

Diego Lourenço





BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
01

Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA	Contrato : 018/2025	BDI : 24,20%	Data Medição : 25/09/2025
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025	Data Base OS : 05/08/2025		Ref. Período : 05/08/2025 a 25/09/2025
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA	Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00		Vencimento : Conforme o contrato
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	Valor desta Medição : 35.819,45		Saldo Contratual : R\$ 77.080,55

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO
9.12	DISPOSITIVO DR (In 30 mA) DIN 100 A	UN	1,00	219,03	272,04	272,04	0%	0%	100%	-	-	272,04
9.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	8,00	21,28	26,42	211,36	0%	0%	100%	-	-	211,36
9.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	126,99	157,72	157,72	0%	0%	100%	-	-	157,72
10.0	PINTURA					R\$ 5.028,41						
10.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023	M2	163,02	1,89	2,35	383,10	0%	0%	100%	-	-	383,10
10.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	73,80	9,23	11,46	845,75	0%	0%	100%	-	-	845,75
10.3	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAO, AF 05/2017	M2	89,22	16,18	20,10	1.793,32	0%	0%	100%	-	-	1.793,32
10.4	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAO, AF 11/2016	M2	163,02	9,68	12,02	1.959,50	0%	0%	100%	-	-	1.959,50
10.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAO, AF 01/2021	M2	4,76	7,91	9,82	46,74	0%	0%	100%	-	-	46,74
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 59,73						
11.1	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019	M2	57,99	0,83	1,03	59,73	0%	0%	100%	-	-	59,73

Observação :	Total Contratado :	112.900,00	Valor Bruto dos Serviços	R\$ 0,00	R\$ 35.819,45	R\$ 77.080,56
			(-) DESCONTOS			
			% concluído da obra	31,73%		
			Valor dos Serviços			
			Valor ISSQN a recolher (DUAM)			
			TOTAL DOS DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			LIQUIDO A PAGAR C/BDI	R\$ 0,00	R\$ 35.819,45	R\$ 77.080,56

DE ACORDO : VALOR POR EXTENSO TRINTA E CINCO MIL OTOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Responsável pela Empresa



Leandro A. Castro
Membro da comissão

Diego Ferreira Duarte
Membro da comissão

Diego Lourenço
Membro da comissão

CREA 17598-DIRO

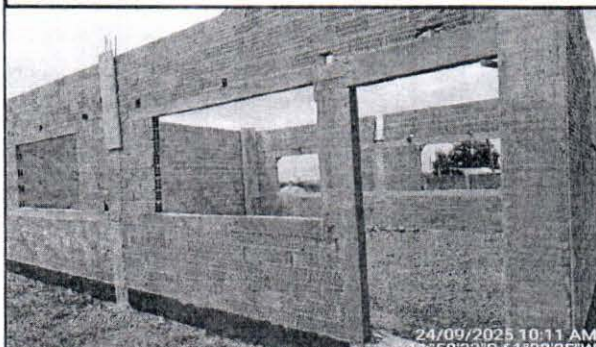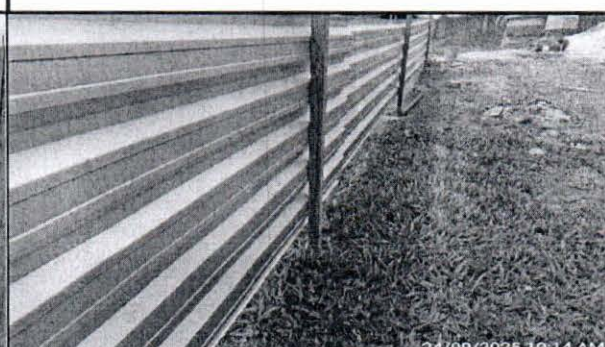

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA ANILTON RIBEIRO	
CONTRATO N°	018/2025	CONVÊNIO N° 334/2024
END:	Querencia do Norte	PROC. 2081-1/2024
LOCAL	DISTRITO - PRIMAVERA DE RONDÔNIA	26092025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª medição		
 24/09/2025 10:10 AM 11°58'32"S 61°22'26"W	 24/09/2025 10:07 AM 11°58'33"S 61°22'25"W	
 24/09/2025 10:07 AM 11°58'33"S 61°22'25"W	 24/09/2025 10:11 AM 11°58'33"S 61°22'25"W	
 24/09/2025 10:11 AM 11°58'33"S 61°22'25"W	 24/09/2025 10:14 AM 11°58'33"S 61°22'25"W	
 24/09/2025 10:13 AM	 24/09/2025 10:14 AM 11°58'33"S 61°22'25"W	

Diego Lourenço



Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Documentos Migrados (Processos Físico)		Fls. 626-650		17/03/2026	
ID:	31924			Processo	Documento
CRC:	9D65730C				
Processo:	2-2081/2024				
Usuário:	IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA				
Criação:	17/03/2026 20:52:41	Finalização:	17/03/2026 20:52:41		
MD5:	AD773425C9DF9955783BA4BF2BD7410E				
SHA256:	96C534DE5B9E0E9C912FAE3EBEF2D437C6D5F7EBDA6F69939824E3472DAAB8CE				
Súmula/Objeto:					
mig4ração de processo					
INTERESSADOS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA		Primavera de Rondônia		RO	17/03/2026 20:52:41
ASSUNTOS					
CONSTRUÇÃO					17/03/2026 20:52:41

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/primavera informando o ID 31924 e o CRC 9D65730C.
