

							BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO					Apropriação PARCIAL	Medição nº 01
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA			Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025			Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026						
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES			Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato						
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 72.489,43		Saldo Contratual : R\$ 94.810,57								
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.025,86							
1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS C/ SUPORTE E TRAVESSA	M2	3,00	259,34	322,10	966,30	0%	100%	0,00%	-	966,30	-	
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	17,88	47,71	59,26	1.059,56	0%	100%	0,00%	-	1.059,56	-	
										-	-	-	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 9.343,00							
2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO E ENCARREGADO DE OBRAS)	MÊS	1,00	7.522,55	9.343,00	9.343,00	0%	41,00%	59,00%	-	3.830,63	5.512,37	
3.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					R\$ 5.375,41							
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,44	3,31	4,11	227,85	0%	0,00%	100,00%	-	-	227,85	
3.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,40	7,15	8,88	491,95	0%	0,00%	100,00%	-	-	491,95	
3.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	5,00	77,83	96,66	483,30	0%	0,00%	100,00%	-	-	483,30	
3.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	8,00	11,77	14,61	116,88	0%	100,00%	0,00%	-	116,88	-	
3.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,06	1,89	2,34	70,34	0%	100,00%	0,00%	-	70,34	-	
3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,60	53,29	66,18	105,88	0%	100,00%	0,00%	-	105,88	-	
3.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,23	53,29	66,18	478,48	0%	100,00%	0,00%	-	478,48	-	
3.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	125,47	21,55	26,76	3.357,57	0%	100,00%	0,00%	-	3.357,57	-	
3.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	8,89	11,04	37,09	0%	100,00%	0,00%	-	37,09	-	
3.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9,80	0,50	0,62	6,07	0%	100,00%	0,00%	-	6,07	-	
					#VALOR!								
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 2.457,41							
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	5,18	131,30	163,07	844,70	0%	100,00%	0,00%	-	844,70	-	
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,72	95,94	119,15	324,08	0%	100,00%	0,00%	-	324,08	-	
4.3	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM FORN.DE MATERIAL.	M3	13,69	75,79	94,13	1.288,63	0%	100,00%	0,00%	-	1.288,63	-	



										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO				Apropriação	Medição nº
										PARCIAL		01			
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA				Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026							
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025				Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026							
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES				Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato							
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA				Valor desta Medição : 72.489,43				Saldo Contratual : R\$ 94.810,57							
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)					
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO			
5.0	INFRAESTRUTURA					R\$ 8.702,25					-	-			
FUNDAÇÃO															
5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,34	396,06	491,90	167,24	0%	100%	0%	-	167,24	-			
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	5,76	153,72	190,92	1.099,69	0%	100%	0%	-	1.099,69	-			
5.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	1,98	488,83	607,12	1.202,09	0%	100%	0%	-	1.202,09	-			
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF 01/2024	KG	41,32	12,16	15,10	623,93	0%	100%	0%	-	623,93	-			
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 01/2024	KG	6,86	15,56	19,32	132,53	0%	100%	0%	-	132,53	-			
VIGA DE BALDRAME															
5.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	15,09	51,12	63,49	958,06	0%	100%	0%	-	958,06	-			
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	92,00	9,50	11,79	1.084,68	0%	100%	0%	-	1.084,68	-			
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,00	12,15	15,09	407,43	0%	100%	0%	-	407,43	-			
5.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	1,13	488,83	607,12	686,04	0%	100%	0%	-	686,04	-			
5.10	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	1,81	590,01	732,79	1.326,34	0%	100%	0%	-	1.326,34	-			
5.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	19,61	41,65	51,72	1.014,22	0%	100%	0%	-	1.014,22	-			
6.0	SUPERESTRUTURA					R\$ 11.343,32									
PILARES															
6.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	12,00	79,16	98,31	1.179,72	0%	100%	0%	-	1.179,72	-			
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	258,00	7,95	9,87	2.546,46	0%	100%	0%	-	2.546,46	-			
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	56,00	11,41	14,17	793,52	0%	100%	0%	-	793,52	-			



 BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação PARCIAL		Medição nº 01	
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA			Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025			Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026						
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES			Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato						
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 72.489,43				Saldo Contratual : R\$ 94.810,57						
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,90	909,45	1.129,53	1.016,57	0%	100%	0%	-	1.016,57	-	
VIGA RESPALDO													
6.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	15,09	93,84	116,54	1.758,58	0%	100%	0%	-	1.758,58	-	
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,00	10,67	13,25	808,25	0%	100%	0%	-	808,25	-	
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	12,15	15,09	407,43	0%	100%	0%	-	407,43	-	
6.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,13	909,45	1.129,53	1.276,36	0%	100%	0%	-	1.276,36	-	
6.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	43,02	53,43	320,58	0%	100%	0%	-	320,58	-	
6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	43,70	54,27	662,09	0%	100%	0%	-	662,09	-	
6.11	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,20	37,87	47,03	573,76	0%	100%	0%	-	573,76	-	
7.0	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 18.933,01							
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	73,74	105,90	131,52	9.698,28	0%	100%	0%	-	9.698,28	-	
7.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,47	488,32	606,49	891,54	0%	0%	100%	-	-	891,54	
7.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	2,95	522,70	649,19	1.915,11	0%	0%	100%	-	-	1.915,11	
7.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,48	280,07	347,84	6.428,08	0%	0%	100%	-	-	6.428,08	
8.0	COBERTURA E FORRO					R\$ 15.567,37							
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	UN	50,16	54,91	68,19	3.420,41	0%	0%	100%	-	-	3.420,41	
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	4,00	948,95	1.178,59	4.714,36	0%	50%	50%	-	2.357,18	2.357,18	



										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação PARCIAL		Medição nº 01	
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA				Contrato : 016/2025				BDI 24,20%				Data Medição : 24/02/2026											
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025				Data Base OS : 05/08/2025				CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC				Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026											
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES				Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00				PROCESSO 575/SEMEC/2025				Vencimento : Conforme o contrato											
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA				Valor desta Medição : 72.489,43				Saldo Contratual : R\$ 94.810,57															
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)													
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO											
8.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,28	12,84	15,94	1.327,48	0%	34%	66%	-	451,34	876,14											
8.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	83,28	35,90	44,58	3.712,62	0%	34%	66%	-	1.262,29	2.450,33											



										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO			Apropriação PARCIAL	Medição nº 01
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA			Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026							
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025			Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026							
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES			Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato							
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 72.489,43		Saldo Contratual : R\$ 94.810,57									
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)				
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO		
8.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	8,49	58,86	73,10	620,61	0%	52%	48%	-	322,72	297,89		
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,98	51,97	64,54	1.095,88	0%	0%	100%	-	-	1.095,88		
8.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	11,54	47,17	58,58	676,01	0%	0%	100%	-	-	676,01		
9.0	PISOS E REVESTIMENTOS					R\$ 27.151,34								
9.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	20,35	416,75	517,60	10.533,16	0%	100%	0%	-	10.533,16	-		
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	144,65	61,53	76,42	11.054,15	0%	0%	100%	-	-	11.054,15		
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	M2	50,14	89,35	110,97	5.564,03	0%	0%	100%	-	-	5.564,03		
10.0	ESQUADRIAS					R\$ 32.145,46								
10.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	15,24	1.312,59	1.630,23	24.844,70	0%	0%	100%	-	-	24.844,70		
10.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN.	12,00	71,95	89,36	1.072,32	0%	0%	100%	-	-	1.072,32		
10.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	4,00	225,71	280,33	1.121,32	0%	0%	100%	-	-	1.121,32		
10.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	7,80	527,19	654,76	5.107,12	0%	0%	100%	-	-	5.107,12		
11.0	ELETRICA					R\$ 1.356,93								
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN.	1,00	63,01	78,25	78,25	0%	0%	100%	-	-	78,25		
11.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN.	8,00	33,91	42,11	336,88	0%	0%	100%	-	-	336,88		



										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO			Apropriação	Medição nº
										PARCIAL	01			
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA				Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025				Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026						
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES				Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato						
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA				Valor desta Medição : 72.489,43				Saldo Contratual : R\$ 94.810,57						
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)				
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO		
11.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN.	2,00	61,14	75,93	151,86	0%	0%	100%	-	-	151,86		
11.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN.	2,00	25,41	31,55	63,10	0%	0%	100%	-	-	63,10		
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	8,35	10,37	31,11	0%	0%	100%	-	-	31,11		
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	67,00	3,22	3,99	267,33	0%	0%	100%	-	-	267,33		
11.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	28,00	12,32	15,30	428,40	0%	0%	100%	-	-	428,40		
12.0	HIDROSANITARIO					R\$ 30.141,78								
AGUA FRIA														
12.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN.	1,00	636,09	790,02	790,02	0%	100%	0%	-	790,02	-		
12.2	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF 05/2023	UN.	16,00	418,49	519,76	8.316,16	0%	100%	0%	-	8.316,16	-		
ESGOTO SANITARIO														
12.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN.	2,00	511,16	634,86	1.269,72	0%	100%	0%	-	1.269,72	-		
12.4	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF 05/2023	UN.	8,00	325,36	404,09	3.232,72	0%	100%	0%	-	3.232,72	-		
12.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN.	6,00	40,56	50,37	302,22	0%	100%	0%	-	302,22	-		
12.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN.	8,00	32,43	40,27	322,16	0%	100%	0%	-	322,16	-		
12.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN.	2,00	21,92	27,22	54,44	0%	100%	0%	-	54,44	-		



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO											Apropriação	Medição nº
											PARCIAL	01
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA			Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026					
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025			Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026					
Objeto : CONTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES			Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato					
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 72.489,43				Saldo Contratual : R\$ 94.810,57					
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO
12.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,27	31,76	39,44	760,00	0%	100%	0%	-	760,00	-
12.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN.	4,00	30,14	37,43	149,72	0%	100%	0%	-	149,72	-
PEÇAS E ACESSÓRIOS												
12.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	2,00	346,48	430,32	860,64	0%	0%	100%	-	-	860,64
12.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	8,00	248,83	309,04	2.472,32	0%	0%	100%	-	-	2.472,32
12.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	4,00	225,71	280,33	1.121,32	0%	0%	100%	-	-	1.121,32
12.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	4,00	74,27	92,24	368,96	0%	0%	100%	-	-	368,96
12.14	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	2,00	182,60	226,78	453,56	0%	0%	100%	-	-	453,56
12.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	4,00	89,59	111,27	445,08	0%	0%	100%	-	-	445,08
12.16	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN.	4,00	66,60	82,71	330,84	0%	0%	100%	-	-	330,84
12.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN.	2,00	54,56	67,76	135,52	0%	100%	0%	-	135,52	-
12.18	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN.	4,00	388,61	482,65	1.930,60	0%	0%	100%	-	-	1.930,60
12.19	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	2,00	550,57	683,80	1.367,60	0%	0%	100%	-	-	1.367,60
12.20	BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM INOX POLIDO FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	672,45	835,18	1.670,36	0%	0%	100%	-	-	1.670,36
12.21	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN.	10,00	68,94	85,62	856,20	0%	0%	100%	-	-	856,20
12.22	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	68,94	85,62	342,48	0%	0%	100%	-	-	342,48
12.23	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN.	2,00	569,27	707,03	1.414,06	0%	0%	100%	-	-	1.414,06



										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO			Apropriação PARCIAL		Medição nº 01	
Contratado : I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA				Contrato : 016/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 24/02/2026								
Tipo : CONCORRÊNCIA ELETRONICA 04/CPLP/2025				Data Base OS : 05/08/2025		CONVENIO 613/2024/PGE-SEDUC		Ref. Período : 05/08/2025 a 23/02/2026								
Objeto : CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES				Valor do Contrato (R\$) : 167.300,00		PROCESSO 575/SEMEC/2025		Vencimento : Conforme o contrato								
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA				Valor desta Medição : 72.489,43				Saldo Contratual : R\$ 94.810,57								
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)						
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO				
12.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	4,00	236,53	293,77	1.175,08	0%	0%	100%	-	-	1.175,08				
13.0	PINTURA					R\$ 2.643,05										
13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	40,71	2,95	3,66	148,99	0%	0%	100%	-	-	148,99				
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	40,71	24,46	30,37	1.236,36	0%	0%	100%	-	-	1.236,36				
13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	103,26	9,81	12,18	1.257,70	0%	0%	100%	-	-	1.257,70				
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-	R\$ 113,81										
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	50,14	1,83	2,27	113,81	0%	0%	100%	-	-	113,81				
Observação :				Total Contratado :		167.300,00	Valor Bruto dos Serviços			R\$ 0,00	R\$ 72.489,43	R\$ 94.810,57				
							(-) DESCONTOS									
							% concluído da obra 43,33%			% na medição	43,33%					
							Valor dos Serviços									
							Valor ISSQN a recolher (DUAM)									
							TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
							LIQUIDO A PAGAR C/BDI			R\$ 0,00	R\$ 72.489,43	R\$ 94.810,57				
DE ACORDO :				VALOR POR EXTENSO		SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS										
Responsavel pela Empresa Membro da comissaoMembro da comissaoMembro da comissao																





ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Secretaria Municipal de planejamento SEMPLAN

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

No dia **24 de fevereiro de 2026** em conformidade com a verificação da COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS E MATERIAIS, procedeu-se a vistoria dos serviços objeto do Contrato nº 016/2025 e convenio Estadual n.º 613/2024/PGÉ-SEDUC, Nº Processo 575/SEMEC/2024 que se refere à **CONSTRATAÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES**, EM PRIMAVERA DE RONDÔNIA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, e a Firma **I. DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 20.092.950/0001-09**, ao valor global de **R\$ 167.300,00**(Cento e sessenta e sete mil e trezentos reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte(SEMEC), cumprindo assim com a implantação do objeto, constatamos a aplicação de parte do material especificado em planilha orçamentária.

Nesta data está sendo realizada a **1ª Medição** referente ao objeto em questão no valor de **R\$ 72.489,43**(setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), correspondendo a 43,33% nesta medição do serviço executado, representando 43,33% do valor global.

Após a verificação da execução dos serviços conforme referência acima, emitiremos o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, necessário como este.

Primavera de Rondônia - RO, 24 de fevereiro de 2026.

Membros da Comissão:

CLAUDIR FERREIRA DUARTE
ASSESSOR DE ENGENHARIA



DIEGO LOURENÇO
Agente Administrativo (semosp)

LEANDRO ALVES CASTRO
Diretor da Divisão de Frotas



 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA		 Responsável Técnico Claudir Ferreira Duarte CREA: 17598 D/RO
OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA J.A.R		CONVÊNIO: 613/2024/PGE-SEDUC
CONTRATO N° 016/2025		PROC. 575/SEMEC/2024
END: RUA JONAS ANTONIO DE SOUZA		
LOCAL PRIMAVERA DE RONDONIA		24022026
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1º medição		
 19/01/2026 8:51 AM 11°49'51"S 61°19'7"W 483-595 Rua Francisco Soares Primavera de Rondônia	 19/01/2026 8:51 AM 11°49'51"S 61°19'7"W 483-595 Rua Francisco Soares Primavera de Rondônia	
 19/01/2026 8:51 AM 11°49'51"S 61°19'7"W 483-595 Rua Francisco Soares Primavera de Rondônia	 19/01/2026 8:52 AM 11°49'50"S 61°19'7"W 483-595 Rua Francisco Soares Primavera de Rondônia	
 26/01/2026 11:36 AM 11°49'51"S 61°19'7"W 123 Avenida Juscelino Kubitschek Primavera de Rondônia	 26/01/2026 11:38 AM	
 26/01/2026 11:39 AM 11°49'51"S 61°19'7"W 483-595 Rua Francisco Soares Primavera de Rondônia	 30/01/2026 8:13 AM 11°49'51"S 61°19'7"W 483-595 Rua Francisco Soares Primavera de Rondônia	

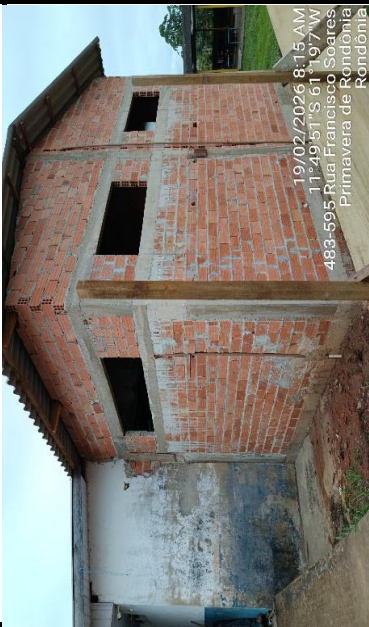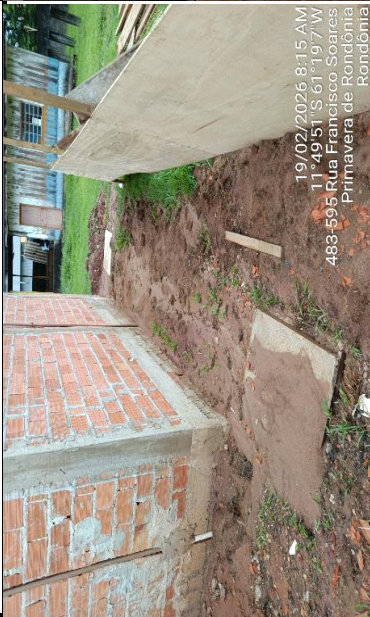

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA				 Responsável Técnico Claudir Ferreira Duarte CREA: 17598 D/RO			
OBJETO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA J.A.R		CONVÊNIO: 613/2024/PGE-SEDUC			
CONTRATO N°		016/2025		PROC. 575/SEMEC/2024			
END:		RUA JONAS ANTONIO DE SOUZA					
LOCAL		PRIMAVERA DE RONDONIA				24022026	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1º medição							
							
							





Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento

Planilha

Identificação/Número

MEDIÇÃO

Data

24/02/2026

ID:

27167

CRC:

6066606F

Processo:

2-575/2025

Usuário:

CLAUDIR FERREIRA DUARTE

Criação:

24/02/2026 10:47:40

Finalização:

24/02/2026 10:50:25

Processo

Documento

MD5:

375251301799AD3C3B409C34391EA576

SHA256:

5A2CE916FAB66EC816D2C6D3B8B45BB2D2D13094E16197D2E82AD16ECAEDCC78

Súmula/Objeto:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA

Primavera de Rondônia

RO

24/02/2026 10:49:37

ASSUNTOS

ASSUNTO NAO INFORMADO

24/02/2026 10:47:40

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

CLAUDIR FERREIRA DUARTE

Assessor de Engenharia

24/02/2026 10:50:29

LEANDRO ALVES CASTRO

Diretor da Divisão da Frota Municipal

24/02/2026 11:38:22

DIEGO LOURENÇO

AGENTE ADMINISTRATIVO

25/02/2026 11:18:27

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/primavera informando o ID 27167 e o CRC 6066606F.
