	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000001
	Dias Decorridos: 1	Data: 16/01/2026 (Sexta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 90	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DA OBRA	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos





Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14



Galaxy A14




Galaxy A14



Fiscal

Responsável Técnico


	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000002
	Dias Decorridos: 6	Data: 21/01/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 85	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Preparo e regularização de terreno em desnível	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos

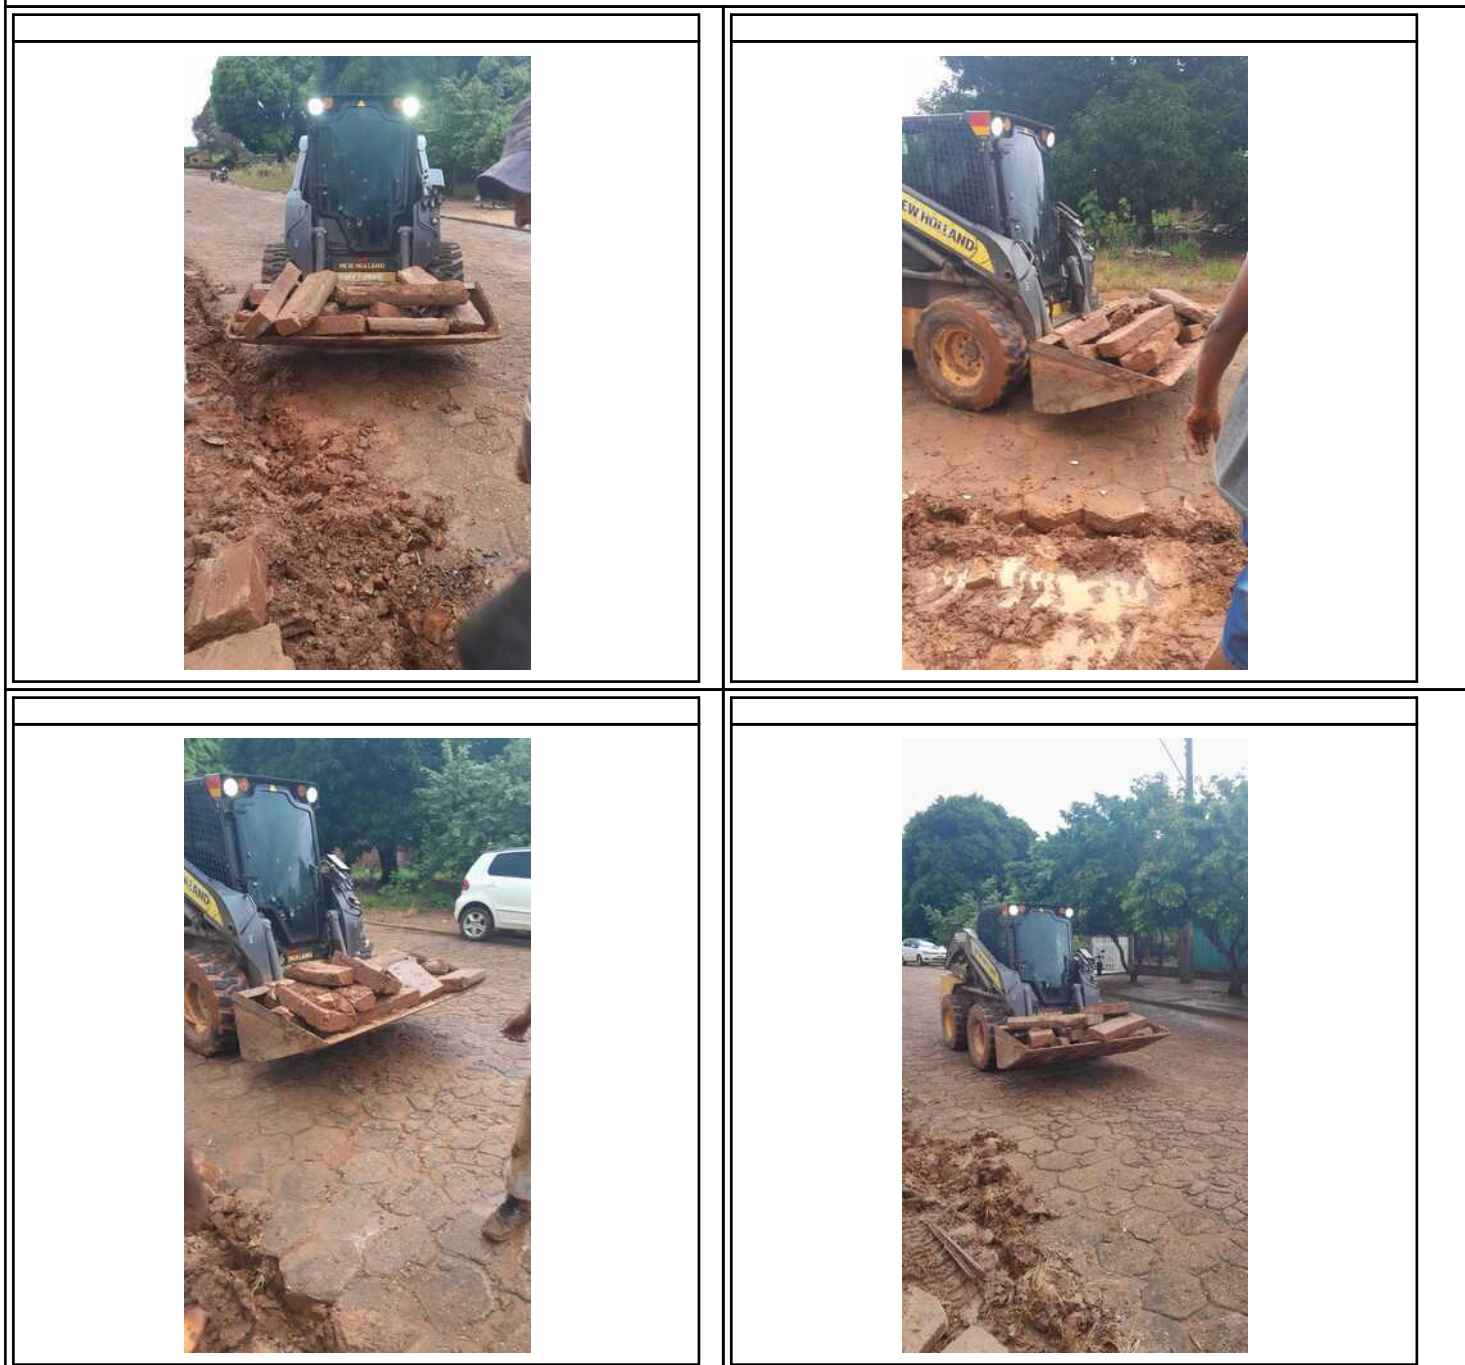












Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000003
	Dias Decorridos: 7	Data: 22/01/2026 (Quinta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 84	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Preparo e regularização de terreno em desnível	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>REGULARIZAÇÃO DO SOLO</p> 	<p>REGULARIZAÇÃO DO SOLO</p> 

Fiscal

Responsável Técnico





	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000004
	Dias Decorridos: 8	Data: 23/01/2026 (Sexta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 83	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
DESCARREGAMENTO DOS MATERIAIS	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos

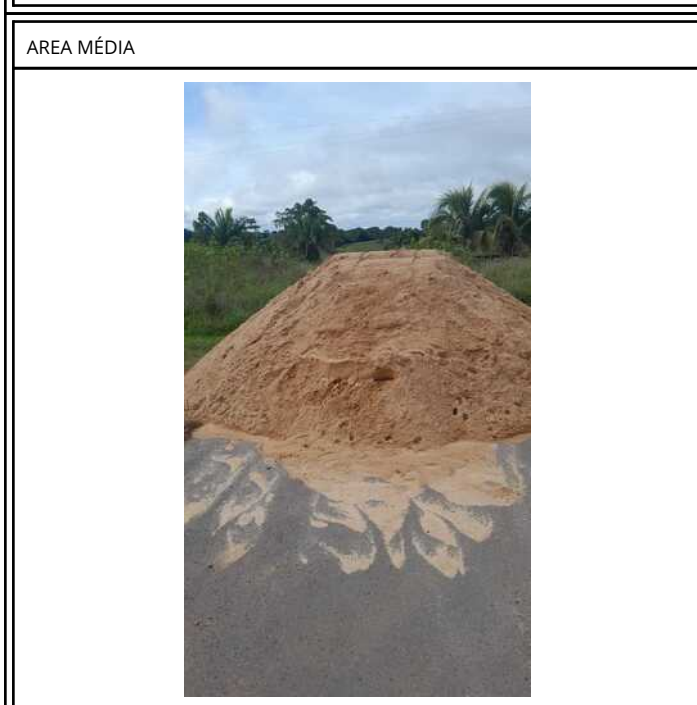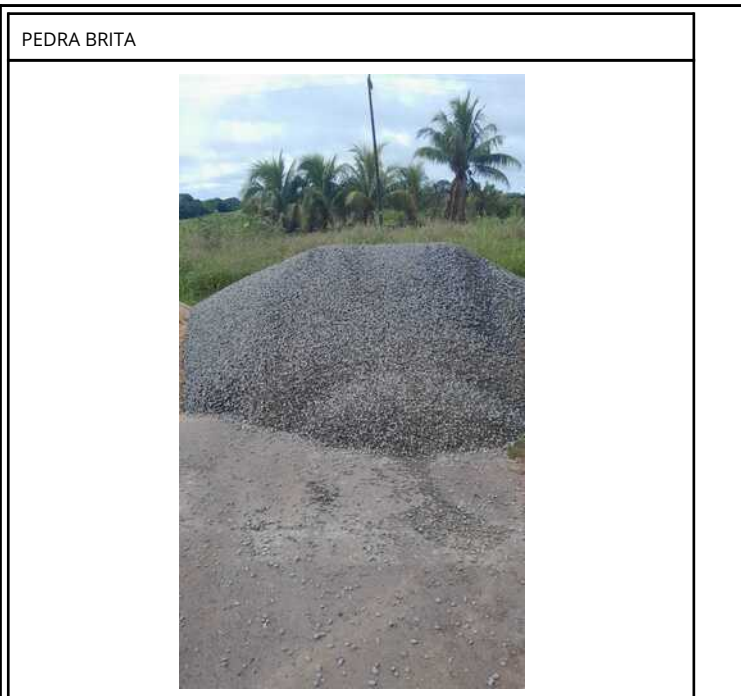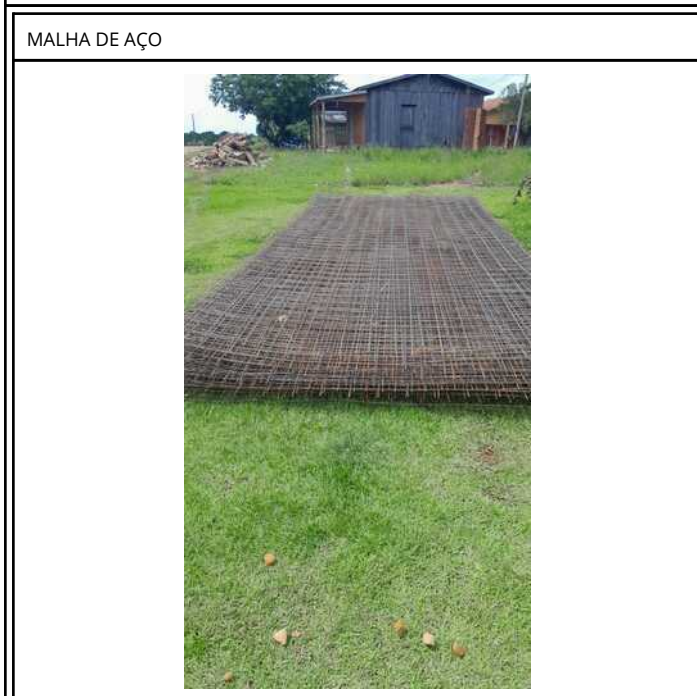

Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000005
	Dias Decorridos: 11	Data: 26/01/2026 (Segunda-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 80	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026



Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Preparo e regularização de terreno em desnível	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos

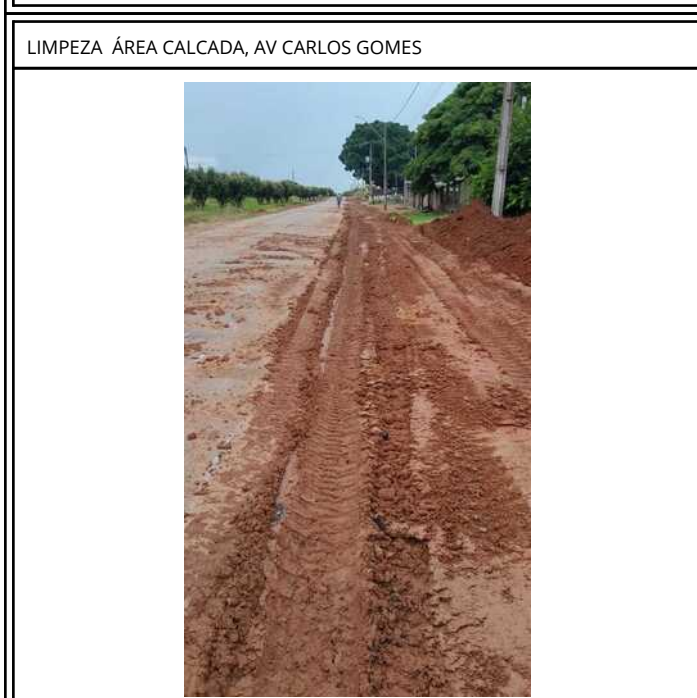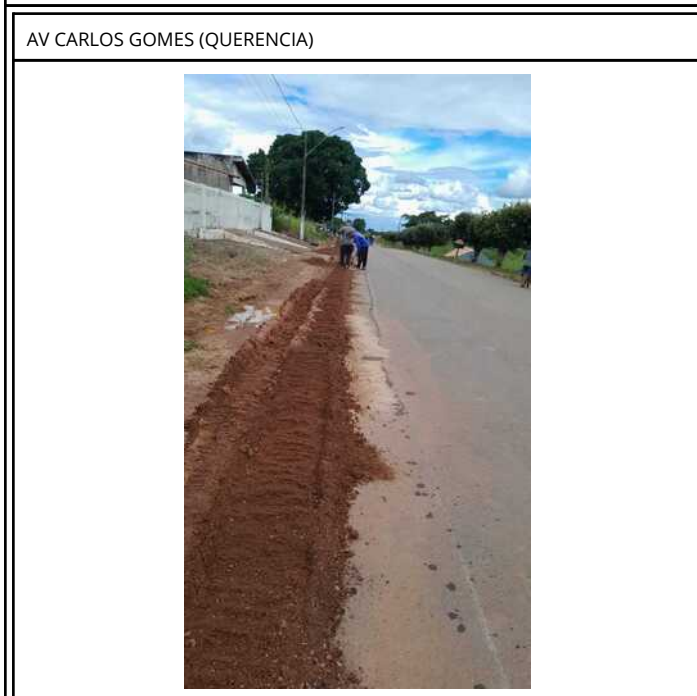

LIMPEZA VALA MEIO FIO



LIMPEZA VALA MEIO FIO



COMPACTAÇÃO VALA MEIO FIO AV CARLOS GOMES



COMPACTAÇÃO VALA MEIO FIO AV CARLOS GOMES




LIMPEZA VALA MEIO FIO



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000006
	Dias Decorridos: 12	Data: 27/01/2026 (Terça-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 79	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000	Termino Previsto: 16/04/2026	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - FEITO COM EXTRUSSORA</p> 	

Fiscal

Responsável Técnico


	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000007
	Dias Decorridos: 13	Data: 28/01/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 78	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais	1.0		nenhum	
Preparo e regularização de terreno em desnível	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos

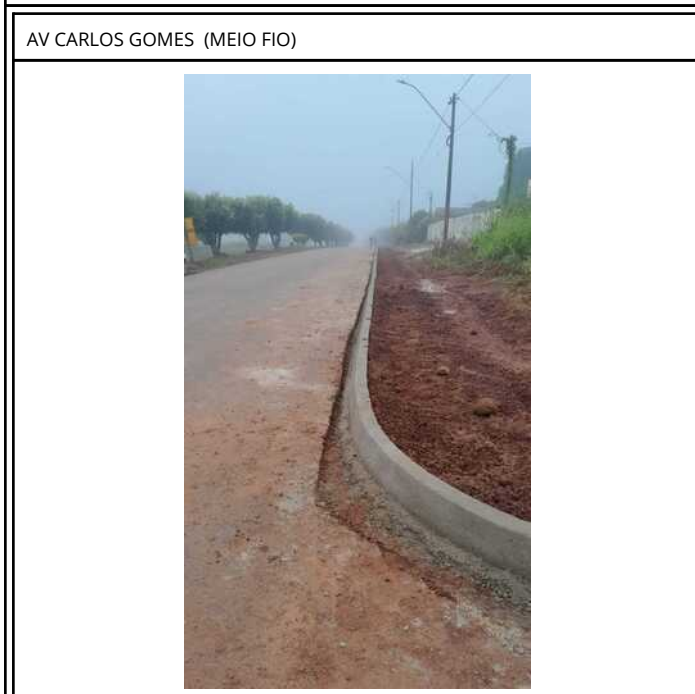

COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA MEIO FIO, RUA TRANCREDO NEVES



RETIRADA DE MEIO FIO RUA COSTA E SILVA POSTO DE SAÚDE COM QUADRA DE ESPORTE



COMPACTAÇÃO RUA COSTA SILVA POSTO DE SAÚDE



COMPACTAÇÃO SOLO MEIO FIO, RUA TANCREDO NEVES



RUA TRANCREDO NEVES ENFRETE ESCOLA ESTADUAL MEIO FIO



MEIO FIO AV CARLOS GOMES LATERAL ESCOLA ESTADUAL E POSTO DE SAÚDE



REBAIXAMENTO DE MEIO FIO PARA RAMPA CADEIRANTES, AV CARLOS GOMES



AV CARLOS GOMES MEIO FIO COM ENTRADA CADERANTE



COMPACTAÇÃO BASE MEIO FIO RUA TRANCREDO NEVE




COMPACTAÇÃO VALA MEIO FIO AV CARLOS GOMES



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000008
	Dias Decorridos: 14	Data: 29/01/2026 (Quinta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 77	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos



	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000009
	Dias Decorridos: 19	Data: 03/02/2026 (Terça-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Término: 72	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Término Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Preparo e regularização de terreno em desnível	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos


ATERRO CASCALHO - 01 AV CARLOS GOMES , PREPARAÇÃO PARA CALÇADA EM CONCRETO 0.06 CM



ATERRO COM COMPACTAÇÃO CASCALHO AV CARLOS GOMES - 2




ATERRO CASCALHO AV CARLOS GOMES PARA CALÇADAS

Fiscal



Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000010
	Dias Decorridos: 20	Data: 04/02/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 71	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>MONTAGENS DE ESPAÇO PARA CONCRETAGEM , LONA , MALHA DE FERRO COM ESPESSURÁ 0.06 CM RUA TRANCREDO NEVES , ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ</p> 	<p>CONCRETAGEN CALÇADAS 0.06 CM COM LONAS E MALHA DE FERRO ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ</p> 

CONCRETAGEN DE CALÇADAS 0.06 CM RUA TRANCREDO NEVES ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ



CONCRETAGEN DE CALÇADAS 0.06 CM RUA TRANCREDO NEVES ESCOLA ESTADUAL TRANCREDO NEVES




CONCRETAGEN DE CALÇADAS 0.06 CM RUA TRANCREDO NEVES ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000011
	Dias Decorridos: 21	Data: 05/02/2026 (Quinta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Término: 70	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Término Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos

<p>ADESIVO PLACA DA OBRA</p> 	
--	--

Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000012
	Dias Decorridos: 22	Data: 06/02/2026 (Sexta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 69	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>COLOCAÇÃO DE LONA E MALHA DE FERRO PARA CONCRETAGEM RUA COSTA SILVA</p> 	<p>CONCRETAGEM DE CALÇADAS AV CARLOS GOMES - 2 , TERRA PLANAGEN COMPACTADA , LONA PLÁSTICA , MALHAS DE FERRO CONCRETO</p> 

Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000013
	Dias Decorridos: 25	Data: 09/02/2026 (Segunda-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 66	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	


Galeria de Fotos	
<p>TERRA PREPARADA PARA PLANTIO DE GRAMA E TERRA PREPARADA PARA CONCRETAGEM PARA COLOCAR PISO TÁTICO .. RUA TRANCREDO NEVES ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ (QUERENCIA)</p> 	<p>CONCRETAGEM DE CALÇADAS 0.06 CM , RUA COSTA E SILVA (QUERENCIA)</p> 

CALÇADA LASTRO LONA E MALHA DE FERRO RUA COSTA E SILVA
(QUÉRENCIA)



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000014
	Dias Decorridos: 27	Data: 11/02/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 64	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>RAMPA CONCRETAGEN PARA VEICULOS POSTO DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, RUA COSTA E SILVA (QUERENCIA)</p> 	<p>POSTO DE SAÚDE (QUERENCIA)</p> 
<p>CONCRETAGEN E PREPARAÇÃO LONA E MALHA DE FERRO RUA COSTA E SILVA POSTO DE SAÚDE (QUERENCIA)</p> 	

Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000015
	Dias Decorridos: 32	Data: 16/02/2026 (Segunda-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 59	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>CONCRETAGEM CALÇADAS COM LONA E TELAS , AV CARLOS GOMES (QUERENCIA)</p> 	

Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000016
	Dias Decorridos: 34	Data: 18/02/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 57	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	
EXECUÇÃO DE SARJETAS	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>CONCRETAGEN DE SARGETAS , AV CARLOS GOMES , (QUERENCIA)</p> 	<p>CONCRETAGEN DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO A RESIDÊNCIA AV CARLOS GOMES ,(QUERENCIA)</p> 

RAMPA VEICULOS ASSEMBLEIA DE DEUS , AV CARLOS GOMES (QUERENCIA.)



CONCRETAGEN CALÇADAS AV CARLOS GOMES COM RAMPA CADEIRANTES (QUERENCIA)



CIMENTO



CALÇADA CONCRETADA AV CARLOS GOMES COM RAMPA CADEIRANTES (QUERENCIA)




CONCRETAGEN DE CALÇADAS COM RAMPA CADEIRANTES , RUA COSTA E SILVA (QUERENCIA)



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000017
	Dias Decorridos: 35	Data: 19/02/2026 (Quinta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 56	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos	
<p>PLANTIO DE GRAMA AV CARLOS GOMES QUADRA 01 (QUERENCIA)</p> 	<p>PLANTIO DE GRAMA ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ RUA TRANCREDO NEVES (QUERENCIA.)</p> 

PLANTIO DE GRAMA RUA TRANCREDO NEVES , ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ (QUERENCIA.)



PLANTIO DE GRAMA RUA TRANCREDO NEVES ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ (QUERENCIA.)



PISO PODOTATIL



TAPETES DE GRAMA



TAPETES DE GRAMA



PISO PODOTATIL



TAPETES DE GRAMA



TAPETES DE GRAMA



TAPETES DE GRAMA




PREPARAÇÃO DE TERRA PARA PLANTIO DE GRAMA , AV CALOS GOMES QUADRA 01 (QUERENCIA)



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000018
	Dias Decorridos: 36	Data: 20/02/2026 (Sexta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 55	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			


Galeria de Fotos	
<p>AREIA</p> 	<p>CONCRETAGEM CALÇADAS , AV CARLOS GOMES QUADRA 01 (QUERENCIA.)</p> 

CONCRETAGEN CALÇADAS , AV CARLOS GOMES QUADRA 01 (QUERENCIA.)



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000019
	Dias Decorridos: 39	Data: 23/02/2026 (Segunda-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 52	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			


Galeria de Fotos	
<p>PREPARAÇÃO DE LONA E TELAS PARA CONCRETAGEN PISSO TÁTICO AV CARLOS GOMES QUADRA 01 (QUERENCIA)</p> 	<p>CONCRETAGEN DE BASE PARA PISSO TÁTICO 0.25 X 0.25 CM AV CARLOS GOMES QUADRA 01 (QUERENCIA)</p> 

ATERRO PARA CONCRETAGEN COM LONAS E TELAS AV CARLOS GOMES
QUADRA 01 (QUERENCIA)



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000020
	Dias Decorridos: 41	Data: 25/02/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 50	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000	Termino Previsto: 16/04/2026	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	1.0		nenhum	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	1.0		nenhum	


Galeria de Fotos	
<p>ARGAMASSA ACIII</p> 	<p>CONCRETAGEN CALÇADAS COM MALHA DE FERRO E LONAS , RUA JUSTINO FERREIRA DE ANDRADE , ESCOLA MUNICIPAL ALMILTON RIBEIRO (QUERENCIA)</p> 

PREPARAÇÃO DE CALÇADAS LONAS , MALHAS DE FERRO E CONCRETAGEN
PISSO RUA JUSTINO FERREIRA DE ANDRADE (QUERENCIA)



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000021
	Dias Decorridos: 42	Data: 26/02/2026 (Quinta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 49	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL RUA TRANCREDO NEVES ESCOLA ESTADUAL ESTÁCIO DE SÁ (QUERENCIA)




ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL ESCOLA ESTADUAL DISTRITO DE QUERENCIA



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000022
	Dias Decorridos: 43	Data: 27/02/2026 (Sexta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 48	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	1.0		nenhum	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos

INSTALAÇÃO DO PISO PODOTÁTIL




PLACA DA OBRA INSTALADA NO LUGAR QUE O ENGENHEIRO FISCAL SOLICITOU



PLACA DA OBRA INSTALADA NO LUGAR QUE O ENGENHEIRO FISCAL SOLICITOU



	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000023
	Dias Decorridos: 46	Data: 02/03/2026 (Segunda-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 45	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Termino Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
<p>INSTALAÇÃO DO PISO PODOTÁTIL AV CARLOS GOMES QUADRA 02 DISTRITO DE QUERENCIA</p> 	

Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000024
	Dias Decorridos: 48	Data: 04/03/2026 (Quarta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Terminar: 43	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000	Termino Previsto: 16/04/2026	
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos

PISO PODOTÁTIL RUA COSTA SILVA POSTO DE SAÚDE DISTRITO DE QUERENCIA



PISO PODOTATIL QUADRA 02 COM RUA COSTA SILVA DESTRITO DE QUERENCIA



CORTES DE CALÇADAS DILATAÇÃO QUADRA 02 AV CARLOS GOMES DISTRITO DE QUERENCIA .




RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO PODOTÁTIL RUA COSTA SILVA POSTO DE SAÚDE DESTRITO QUERENCIA



Fiscal

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000025
	Dias Decorridos: 50	Data: 06/03/2026 (Sexta-Feira)
Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE - RO	Dias para Término: 41	Início: 16/01/2026
Endereço: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, CENTRO, 1466, Primavera de Rondônia - RO, 76976-000		Término Previsto: 16/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.0		nenhum	
Espalhamento de material em bota-fora	1.0		nenhum	

Fiscal

Responsável Técnico
